


【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進み具合をお知らせします。】

工事の進捗率 (令和3年11月末現在)

90.5 %

十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。

計画図

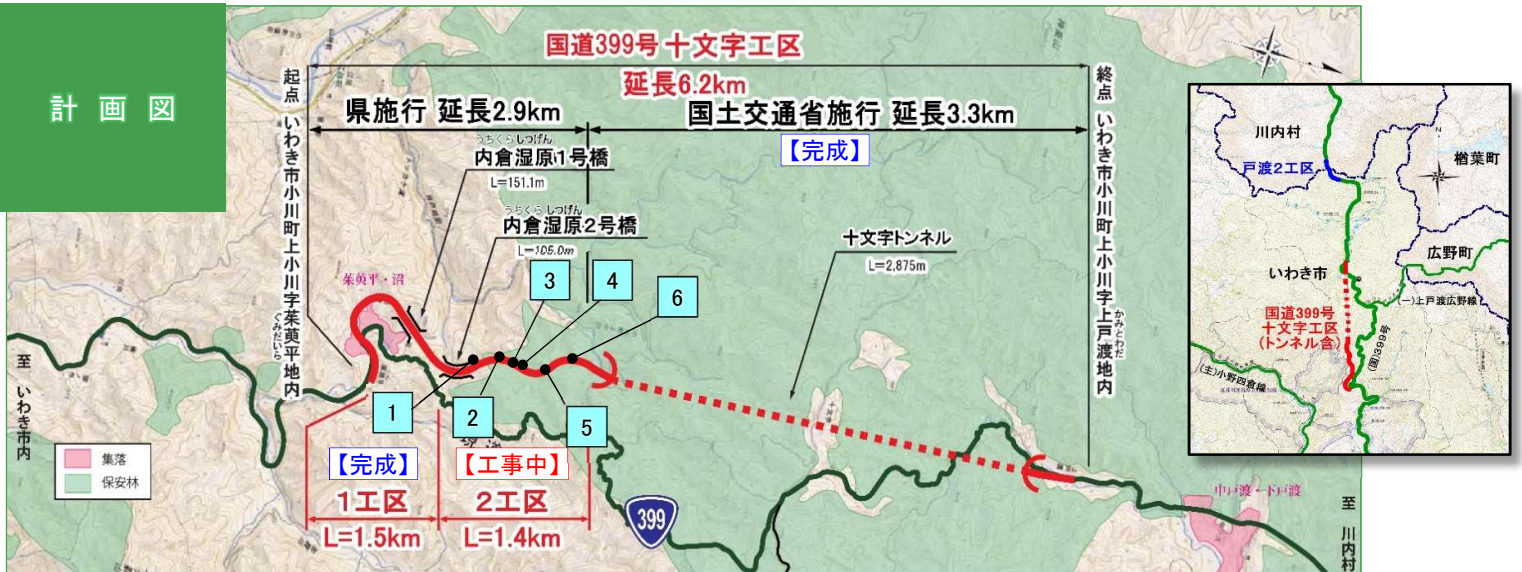

施工状況

現在、県施工区間2工区の道路改良工事、法面工事を施工中です。

令和3年3月に県施工区間1工区が完成。令和3年9月にはトンネルを含む直轄権限代行区間が完成しました。現在、県施工区間2工区の補強土壁工や法面保護工を施工中です。

2工区 道路改良

県施工2工区の道路改良工事では、全10基の補強土壁のうち9基が完成し、残る1基となる11号補強土壁を施工しています。天端のコンクリート打設が終わり、養生後に型枠を外せば完成です。

2工区 法面工

切土を行った法面については、雨水等により表面が浸食を受けてしまうことから植生による保護工を施工しています。法面作業は転落等の危険が伴うため、安全帯をしっかり装着し作業を行っています。



切土の法面保護工が完成しました。




路床面、側溝、法面まで完成しています。



10号補強土壁が完成し、C5切土作業を行っています。



11号補強土壁の最後のコンクリート打設が終了しました。

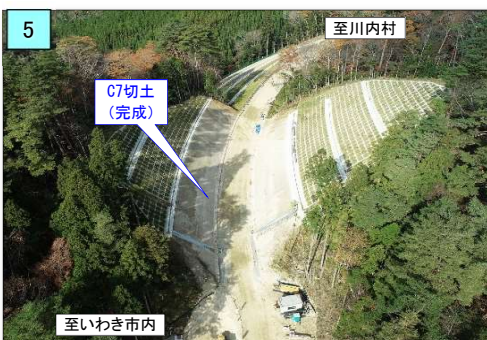

C7切土も最後の段まで掘削完了しました。



路床面まで完成し、側溝及び法面を施工中です。



福島県いわき建設事務所

〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15

TEL:0246-35-6046 FAX:0246-24-6256

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>
