




# 令和4年8月3日からの大雨に伴う 災害復旧の進捗状況



福島県土木部  
令和5年9月30日現在

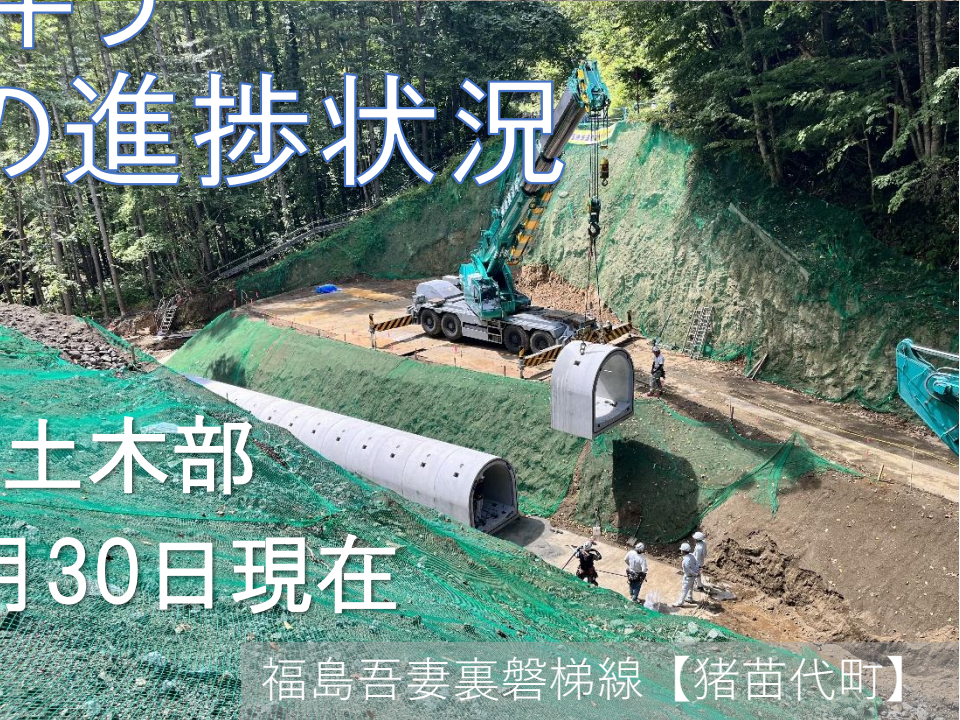

## 災害復旧事業全体の進捗状況（令和5年9月30日現在）

工種	査定箇所数 (箇所)	着工箇所数 (箇所)	着工率 (%)	完了箇所数 (箇所)	完了率 (%)
道路	24	17	70.8	3	12.5
橋梁	1	0	0.0	0	0.0
河川	87	86	98.8	27	31.0
合計	112	103	91.9	30	26.7

# 災害復旧事業の進捗状況について（道路）

## 福島吾妻裏磐梯線

耶麻郡猪苗代町大字若宮地内

復旧延長	54.0m
復旧概要	排水（函渠）工、舗装工
進捗率	80.0%



施工前

至 福島市



施工状況

至 福島市





# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 杉田川筋

大玉村大山字川原 1 号地内

復旧延長

13.0m

復旧概要

積ブロック工

進捗率

100.0%



施工前



令和5年8月完了





# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 杉田川筋

大玉村大山字川原 2 号地内

復旧延長


51.0m

復旧概要

積ブロック工

進捗率

100.0%

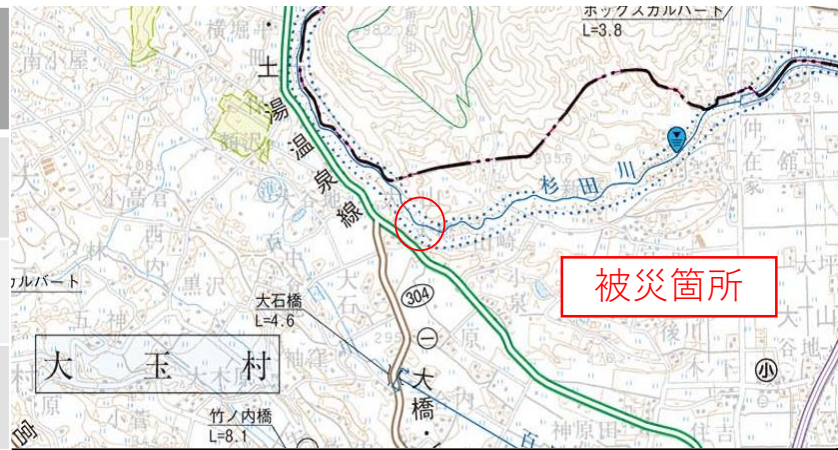

施工前



令和5年8月完了





# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 杉田川筋

大玉村大山字大橋平 2号地内

復旧延長	75.0m
復旧概要	積ブロック工
進捗率	100.0%



施工前



令和5年8月完了





# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 杉田川筋

大玉村大山字前皿久保地内

復旧延長


17.0m

復旧概要

積ブロック工

進捗率

100.0%

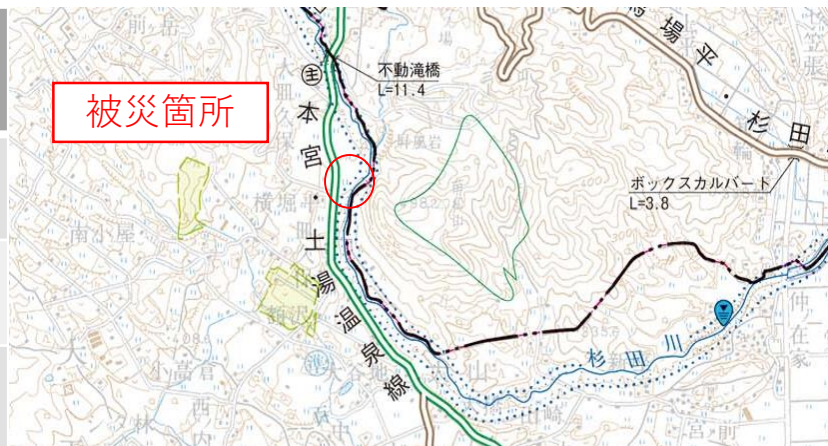

施工前



令和5年8月完了

