



# 令和4年8月3日からの大 雨に伴う 災害復旧の進捗状況



福島県土木部  
令和6年1月31日現在



## 災害復旧事業全体の進捗状況（令和6年1月31日現在）

工種	査定箇所数 (箇所)	着工箇所数 (箇所)	着工率 (%)	完了箇所数 (箇所)	完了率 (%)
道路	24	21	87.5	12	50.0
橋梁	1	0	0.0	0	0.0
河川	87	87	100.0	64	73.5
合計	112	108	96.4	76	67.8





# 災害復旧事業の進捗状況について（道路）

## 福島吾妻裏磐梯線（若宮5号）

耶麻郡猪苗代町大字若宮地内

復旧延長	49.0m
復旧概要	舗装工
進捗率	100.0%





# 災害復旧事業の進捗状況について（道路）

## 熱塩加納山都西会津線

耶麻郡西会津町奥川大字飯沢字寺峯地内

復旧延長	12.0m
復旧概要	舗装工
進捗率	100.0%



施工前



至 熱塩加納

令和5年8月完了



至 熱塩加納



# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 杉田川筋

安達郡大玉村大山字川原2号地内

復旧延長


51.0m

復旧概要

積ブロック工

進捗率

100.0%

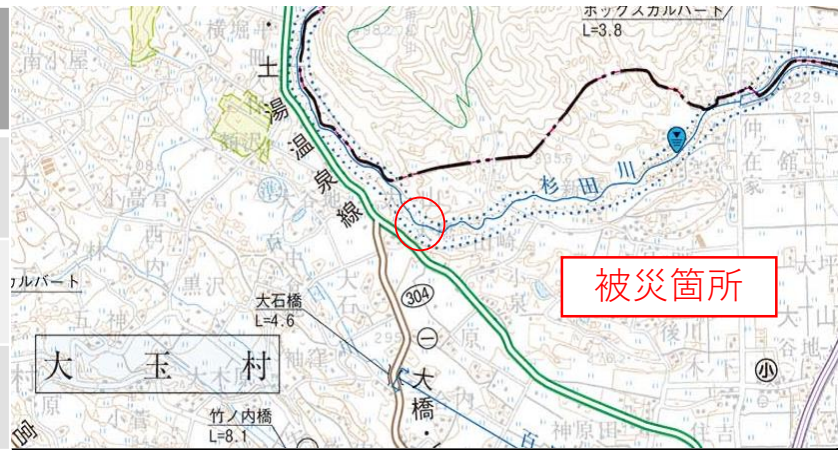

施工前



令和5年8月完了





# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 杉田川筋

安達郡大玉村大山字大橋平2号地内

復旧延長	75.0m
復旧概要	積ブロック工
進捗率	100.0%



施工前



令和5年8月完了





# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 杉田川筋

安達郡大玉村大山字前皿久保地内

復旧延長

17.0m

復旧概要

積ブロック工

進捗率

100.0%



施工前



令和5年8月完了





# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 濁川筋


喜多方市熱塩加納町加納字朴林甲地内

復旧概要

護岸工

進捗率

100.0%

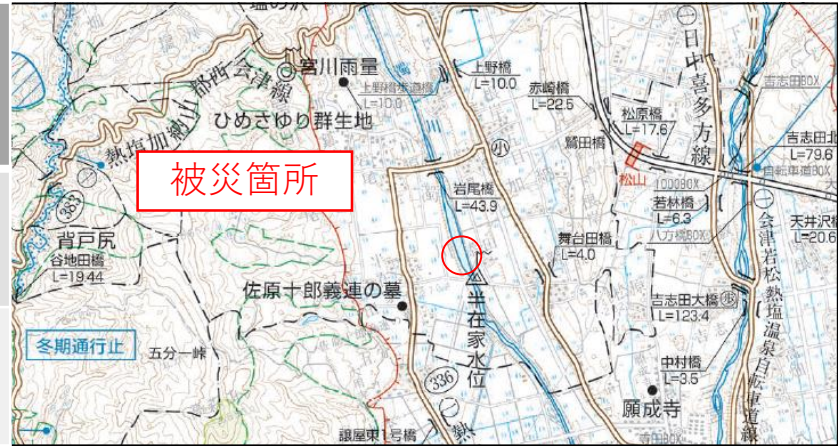

施工前



令和5年11月完了





# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 一ノ戸川筋


喜多方市山都町一ノ木地内

復旧概要

護岸工

進捗率

100.0%

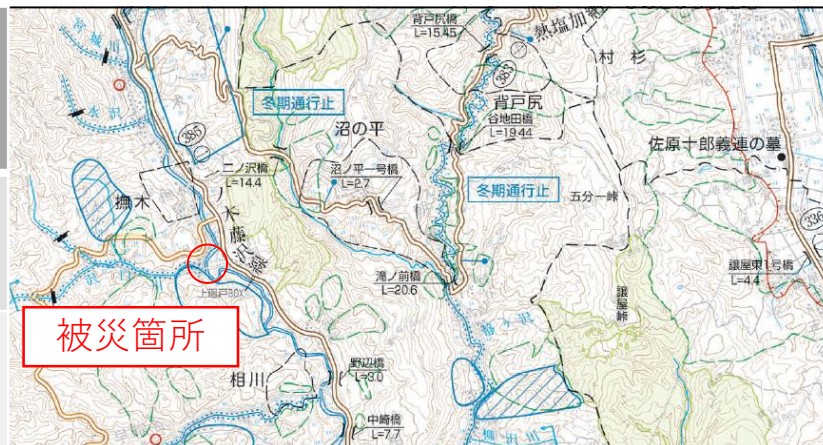

施工前



令和5年11月完了

