



熱塩加納山都西会津線【喜多方市】



令和4年8月3日からの大雨に伴う

災害復旧の進捗状況



福島県土木部
令和6年9月30日現在

福島吾妻裏磐梯線【猪苗代町】

五枚沢川筋【喜多方市】

災害復旧事業全体の進捗状況（令和6年9月30日現在）

工種	査定箇所数 (箇所)	着工箇所数 (箇所)	着工率 (%)	完了箇所数 (箇所)	完了率 (%)
道路	24	21	87.5	16	66.6
橋梁	1	0	0.0	0	0.0
河川	87	87	100.0	85	97.7
合計	112	108	96.4	101	90.1

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

熱塩加納山都西会津線

耶麻郡西会津町奥川大字飯根字小賀所地内

復旧延長	8.0m
復旧概要	コンクリートブロック積工
進捗率	20.0%



施工前



至 西会津

至 山都

施工状況



至 西会津


至 山都

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

熱塩加納山都西会津線

喜多方市山都町大字一ノ木字本川通瀧ノ沢地内

復旧延長	93.5m
復旧概要	大型コンクリートブロック積工
進捗率	70.0%

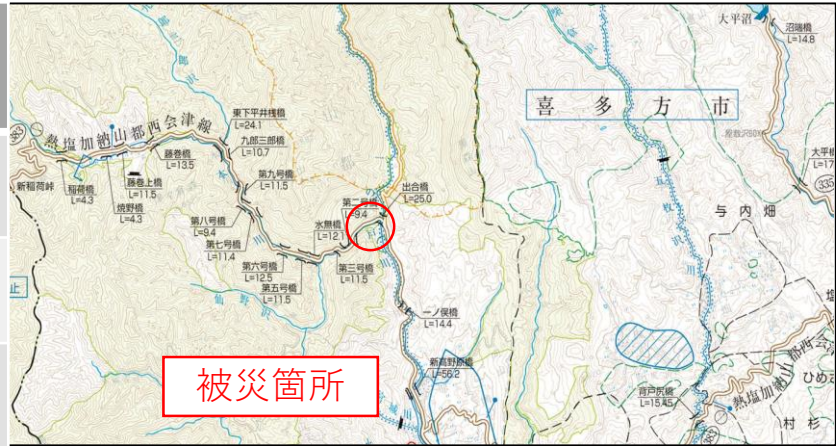

災害復旧事業の進捗状況について（河川）

宮古川筋

喜多方市山都町蓬莱字殿屋敷地内

復旧延長

111.2m

復旧概要

コンクリートブロック積工

進捗率

20.0%



施工前



施工状況



災害復旧事業の進捗状況について（河川）

五枚沢川筋

喜多方市山都町相川字樋越甲地内

復旧延長

26.3m

復旧概要

大型コンクリートブロック積工

進捗率

100.0%



施工前



令和6年9月完了

