

災害公営住宅(地震・津波等被災者向け)の進捗状況(平成29年3月31日時点)



建築住宅課

	事業主体	団地名又は地区名等	計画戸数	構造						現在の状況 設計・建設等	完成予定年度	
				戸建・長屋建			共同住宅					
				木造	非木造		木造	非木造				
自市町村の被災住民(地震・津波等被災)の住宅整備	桑折町	桑折駅前団地	22	22	22		0			入居開始	H27	
		計	22	22	22	0	0	0				
	須賀川市	東町団地	21	0			21		21		入居開始	H27
		馬町団地	11	11	11		0				入居開始	H26
		弘法団地	45	0			45		45		入居開始	H27
		山寺北団地	23	0			23		23		入居開始	H27
		計	100	11	11	0	89	0	89			
	鏡石町	東町団地	24	0			24		24		入居開始	H26
		計	24	0	0	0	24	0	24			
	白河市	葉ノ木平団地	16	0			16		16		入居開始	H26
		計	16	0	0	0	16	0	16			
	矢吹町	中町第一団地	14	0	0		14	14			入居開始	H27
		中町第二団地	23	23	23		0				入居開始	H28
		中畑団地	4	4	4		0				入居開始	H27
		中町第三団地	11	0	0		11	11			入居開始	H28
		計	52	27	27	0	25	25	0			
	相馬市	細田東団地	77	65	65		12	12			入居開始	H25
		刈敷田第2団地	106	70	70		36		36		入居開始	H26
		南戸崎団地	10	0			10	10			入居開始	H24
		南ノ入団地	28	28	28		0				入居開始	H26
		北高野団地	51	51	51		0				入居開始	H26
		馬場野山田団地	12	0			12	12			入居開始	H24
		程田明神前団地	46	46	46		0				入居開始	H24
		狐穴団地	12	0			12		12		入居開始	H24
		山信田団地	56	56	56		0				入居開始	H26
		計	398	316	316	0	82	34	48			
	南相馬市	大町西団地	40	0			40		40		入居開始	H26
		大町東団地	80	0			80	20	60		入居開始	H26
		大町南団地	29	0			29		29		入居開始	H27
		栄町団地	33	0			33		33		入居開始	H27
		萱浜団地	38	38	10	28	0				入居開始	H27
		西町団地	30	0			30		30		入居開始	H26
		西川原団地	28	28	28		0				入居開始	H25
		西川原第二団地	32	0			32		32		入居開始	H27
		小高東町団地	20	20	20		0				入居開始	H27
		万ヶ迫団地	2	0			2	2			入居開始	H27
	小高上町団地	18	0			18	18			入居開始	H27	
	計	350	86	58	28	264	40	224				
	新地町	愛宕東団地	30	0			30		30		入居開始	H25
		駒ヶ嶺原団地	6	6		6	0				入居開始	H25
		中島団地	26	26	26		0				入居開始	H28
		作田東団地	6	6	6		0				入居開始	H26
		作田西団地	9	9	9		0				入居開始	H26
		岡団地	14	14	14		0				入居開始	H26
		雁小屋団地	27	27	27		0				入居開始	H26
大戸浜団地		11	11		11	0				入居開始	H26	
計	129	99	82	17	30	0	30					
いわき市	錦団地	64	0			64		64		入居開始	H25	
	沼ノ内団地	40	0			40		40		入居開始	H25	
	四倉南団地	151	21	21		130		130		入居開始	H26	
	永崎団地	189	24	24		165		165		入居開始	H27	
	関田団地	72	0			72		72		入居開始	H26	
	四沢団地	20	0			20		20		入居開始	H26	
	四沢団地	30	30	30		0				入居開始	H27	
	関船団地	32	0			32		32		入居開始	H25	
	下浅貝団地	13	13	13		0				入居開始	H27	
	下浅貝団地	75	0			75		75		入居開始	H27	
	作田東団地	45	0			45		45		入居開始	H26	
	内郷砂子田団地	110	0			110		110		入居開始	H27	
	内郷砂子田団地	140	0			140		140		入居開始	H27	
	北白土団地	50	0			50		50		入居開始	H27	
	久之浜東団地	120	0			120		120		入居開始	H26	
	久之浜東団地	16	16	16		0				入居開始	H27	
	豊間団地	192	24	24		168		168		入居開始	H26	
	薄磯団地	103	18	18		85		85		入居開始	H26	
佐糠第一団地, 佐糠第二団地	51	0			51		51		入居開始	H27		
計	1,513	146	146	0	1,367	0	1,367					
小計①	2,604	707	662	45	1,897	99	1,798					
広野町	広野原団地	48	10	10		38		38		入居開始	H26	
	折木字大平地区	14	8	8		6	6			建築工事完了	H28	
	計	62	18	18	0	44	6	38				
檜葉町	中満南	15	15	15		0				入居開始	H28	
	一ツ屋	8	8	8		0				入居開始	H27	
	シウ神山	10	10	10		0				入居開始	H28	
	中満	108	108	108		0				建築工事中	H29	
	計	141	141	141	0	0	0	0				
役場機能を移転(一時移転)した市町村	小計②	203	159	159	0	44	6	38				
合計(①+②)		2,807	866	821	45	1,941	105	1,836				

市町村災害公営住宅整備 進捗状況図

平成29年3月31日版
土木部建築住宅課(住宅整備担当)

【単位:戸】

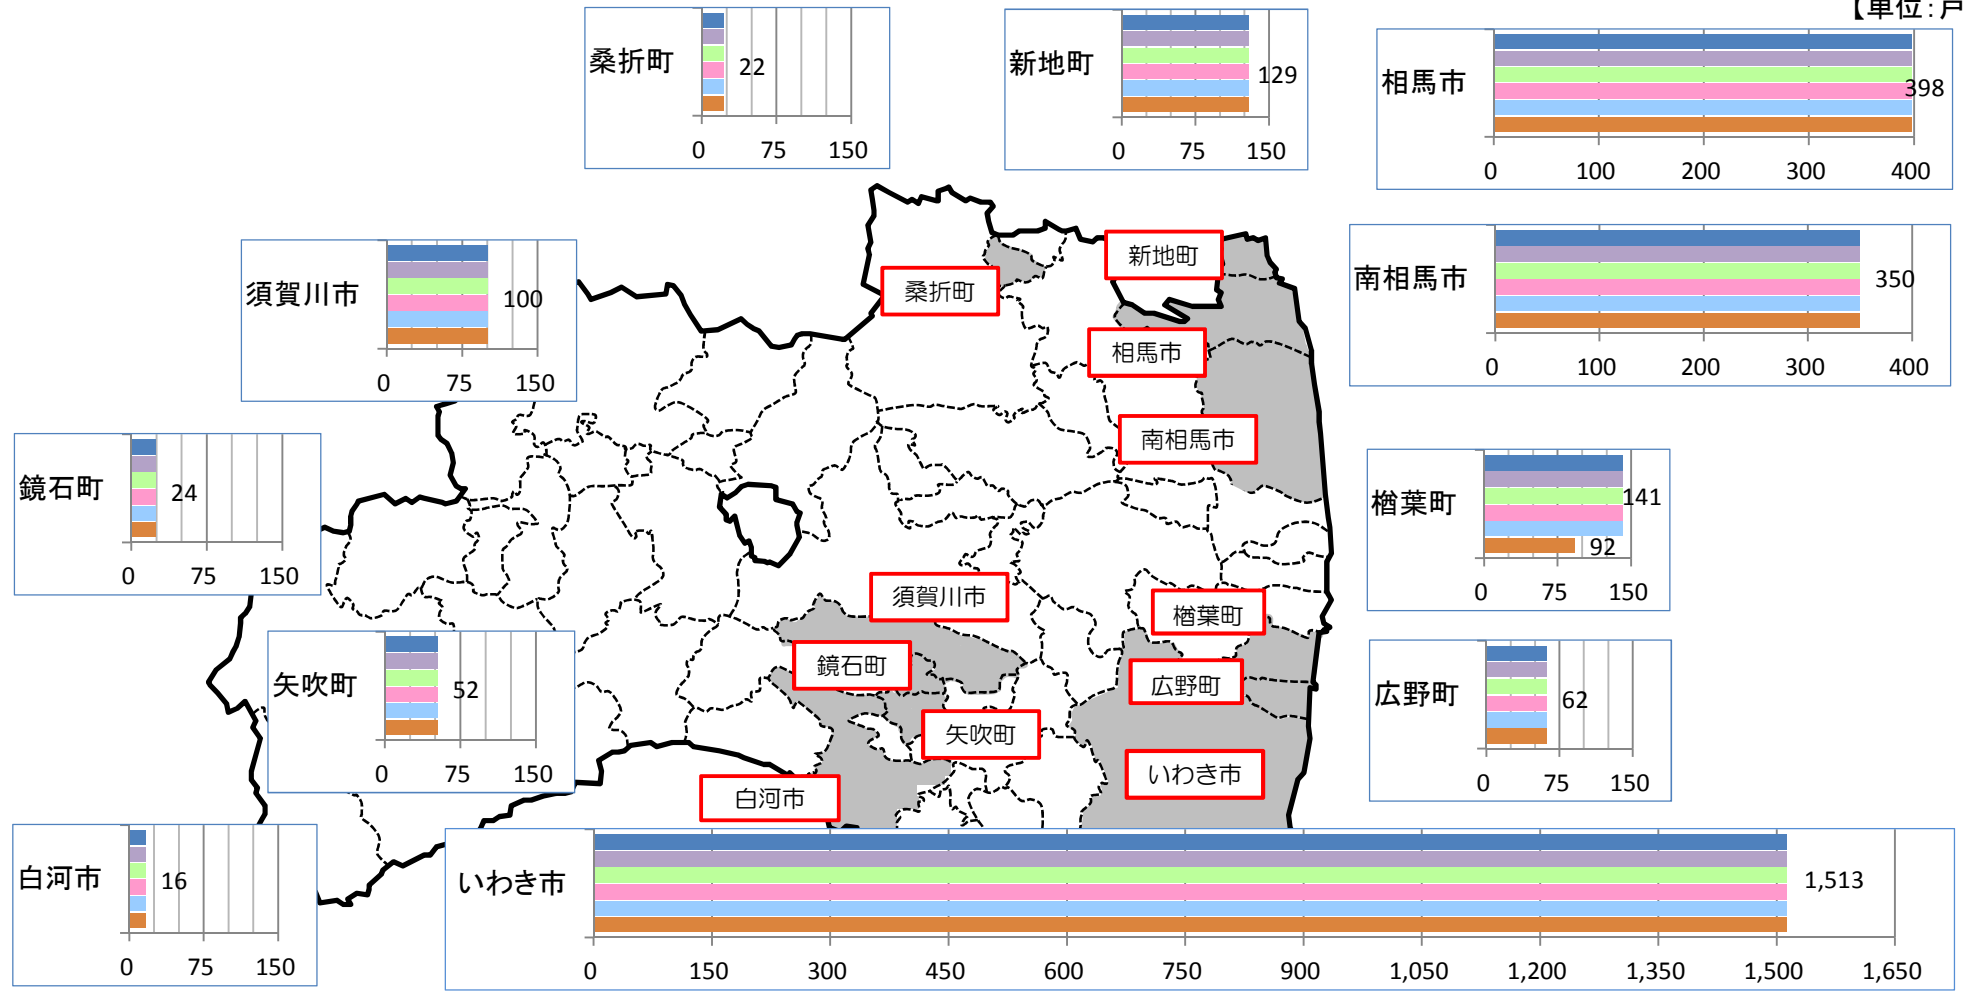

- 計画戸数(整備予定戸数)
- 交付申請
- 用地完了地区
- 建築設計(着手済)
- 建築工事(着手済)
- 建物完成
