

【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進捗具合をお知らせします。】

工事の進捗率(令和4年4月末現在)

95.2 %

十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。

計画図



施工状況

現在、県施工区間2工区の道路改良工事、法面工事を施工中です。


令和3年3月に県施工区間1工区が完成。令和3年9月には十文字トンネルを含む直轄権限代行区間が完成しました。現在、県施工区間2工区の排水施設や安全施設を施工中です。舗装を行なうための準備も始まっております。

2工区 道路改良

県施工2工区の道路改良工事では、切土法面保護工が4月に完了しました。その後、排水設備や凍上抑制層を施工した後、下層路盤を着手します。

2工区 舗装工

ICT測量を行なっており、その後舗装工を行ないます。

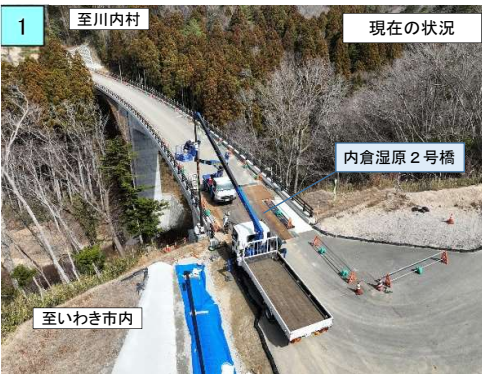

福島県いわき建設事務所

〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15

TEL:0246-35-6125 FAX:0246-24-6058

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>
