


【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進捗具合をお知らせします。】

工事の進捗率(令和4年5月末現在)

95.7 %

十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。

計画図

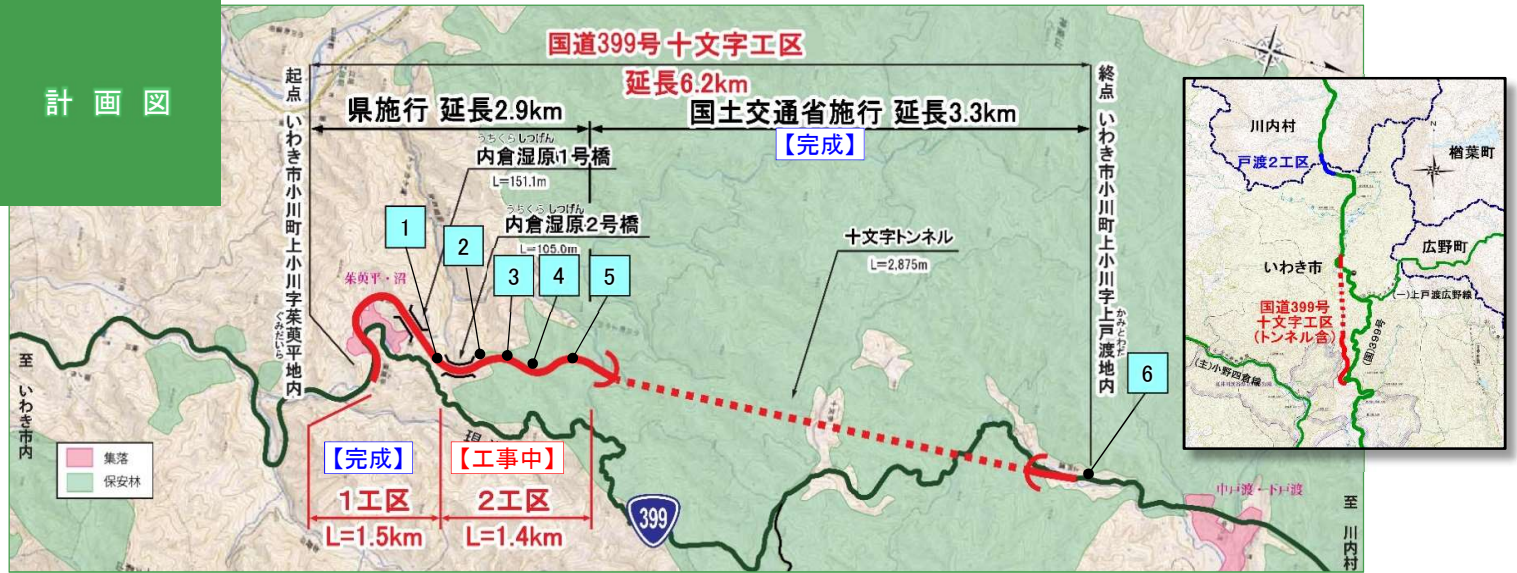

施工状況

現在、県施工区間2工区の道路改良工事、舗装工事を施工中です。

令和3年3月に県施工区間1工区が完成。令和3年9月にはトンネルを含む直轄権限代行区間が完成しました。排水施設や安全施設が概ね完了し、舗装を行うための準備も進めています。

2工区 道路改良

排水施設や安全施設が完了した区域から下層路盤を着手しています。

2工区 舗装工

ICT測量を行っており、その後上層路盤に着手します。



福島県いわき建設事務所

〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15

TEL:0246-35-6125 FAX:0246-24-6058

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>
