


国見町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年10月完了)

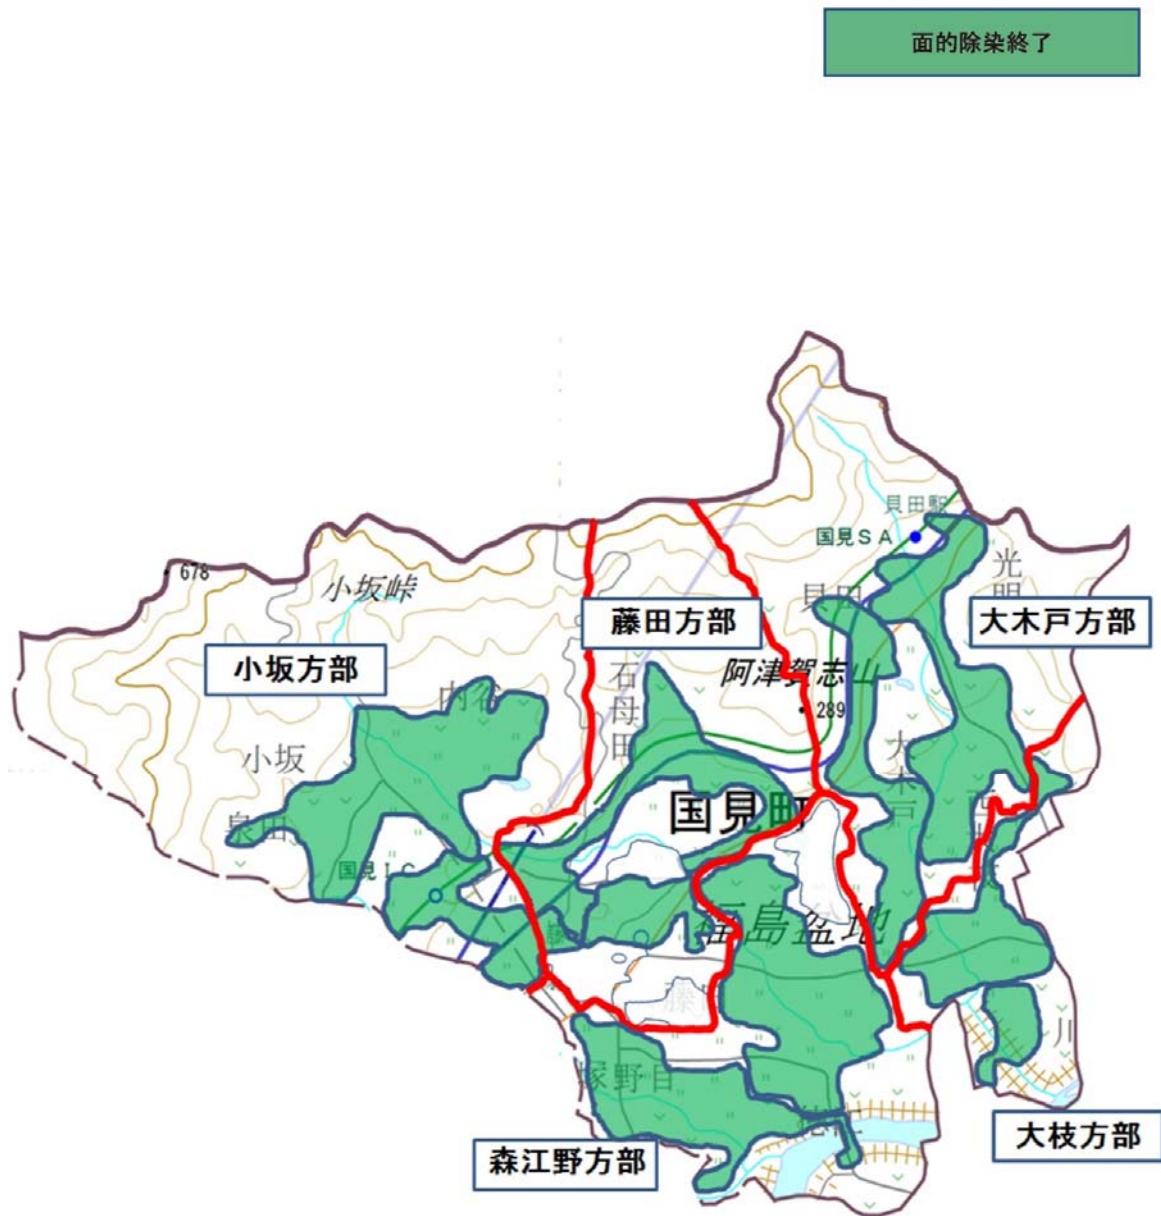

計画数に対する除染の進捗状況(平成29年3月末時点)

住宅(戸)	
進捗数	3,085 (100.0%)
発注数	3,085 (100.0%)
計画数	3,085

公共施設等(施設数)	
進捗数	669 (100.0%)
発注数	669 (100.0%)
計画数	669

道路(km)	
進捗数	176.7 (77.9%)
発注数	226.6 (100.0%)
計画数	226.6

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)	
進捗数	862.1 (100.0%)
発注数	862.1 (100.0%)
計画数	862.1

森林(生活圏)(ha)	
進捗数	29.4 (100.0%)
発注数	29.4 (100.0%)
計画数	29.4



除染作業(表土除去作業)



回収型高圧洗浄機による作業

仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

搬入済み	4ヶ所
搬入中	7ヶ所
搬入前	0ヶ所



土のうで遮へいし、
遮水シートで覆う前の状況



仮置場外壁にデザイン画で装飾
