

平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年6月末時点)

住宅(戸)

進捗数	3,332
発注数	3,332
計画数	3,332

(参考)全体計画数=3,332 戸

公共施設等(施設数)

進捗数	162
発注数	162
計画数	162

(参考)全体計画数=162 施設

道路(km)

進捗数	307
発注数	307
計画数	307

(参考)全体計画数=307 km

森林(生活圏)(ha)

進捗数	0.2
発注数	0.2
計画数	0.2

(参考)全体計画数=0.2 ha



夏井地区除染作業




夏井地区除染作業

仮置場の整備状況(平成27年3月末時点)

搬入済み 0ヶ所
搬入中 2ヶ所
搬入前 1ヶ所



夏井地区仮置場(可燃物)

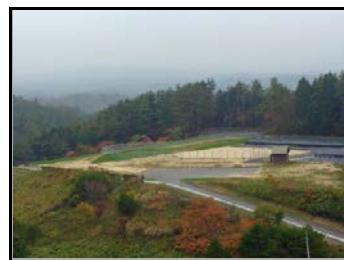

夏井地区仮置場(全景)

小野町の除染情報(小野町のホームページにリンク)

- ・ 小野町除染実施計画
<http://www.town.ono.fukushima.jp/soshiki/5/josen-plan.html>
- ・ 防災
<http://www.town.ono.fukushima.jp/life/1/7/46/>



小野町役場
