
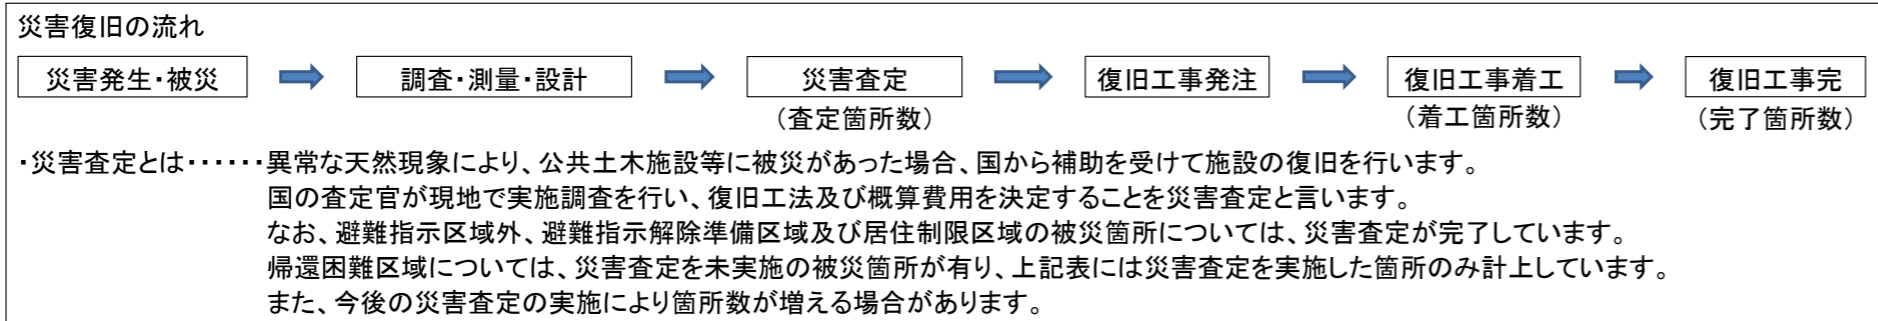







東日本大震災の災害復旧の進捗状況 今後の見通しについて

平成30年8月31日時点

県全体 (避難指示区域外+避難指示区域内)	対査定箇所					平成30年度末見込み		平成31年度末見込み		平成32年度末見込み	
	A 査定箇所	B 着工箇所	C 完了箇所	B/A 着工率	C/A 完了率	G 完了箇所	G/F 完了率	H 完了箇所	H/A 完了率	H 完了箇所	H/A 完了率
県全体 合計	2,145	2,119	2,027	98.8%	94.5%	2,090	97.4%	2,098	97.8%	2,145	100.0%
河川・砂防	283	275	255	97.2%	90.1%	267	94.3%	269	95.1%	283	100.0%
海岸	157	156	131	99.4%	83.4%	149	94.9%	154	98.1%	157	100.0%
道路・橋梁	807	799	790	99.0%	97.9%	798	98.9%	798	98.9%	807	100.0%
港湾	331	331	331	100.0%	100.0%	331	100.0%	331	100.0%	331	100.0%
漁港	470	461	423	98.1%	90.0%	448	95.3%	449	95.5%	470	100.0%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5	100.0%
公営住宅	89	89	89	100.0%	100.0%	89	100.0%	89	100.0%	89	100.0%
避難指示区域外	査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
避難指示区域外 合計	1,786	1,786	1,768	100.0%	99.0%	1,784	99.9%	1,786	100.0%	1,786	100.0%
河川・砂防	216	216	213	100.0%	98.6%	215	99.5%	216	100.0%	216	100.0%
海岸	131	131	122	100.0%	93.1%	130	99.2%	131	100.0%	131	100.0%
道路・橋梁	609	609	609	100.0%	100.0%	609	100.0%	609	100.0%	609	100.0%
港湾	331	331	331	100.0%	100.0%	331	100.0%	331	100.0%	331	100.0%
漁港	402	402	396	100.0%	98.5%	402	100.0%	402	100.0%	402	100.0%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5	100.0%
公営住宅	89	89	89	100.0%	100.0%	89	100.0%	89	100.0%	89	100.0%
避難指示区域内	査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
避難指示区域内 合計	359	333	259	92.8%	72.1%	306	85.2%	312	86.9%	359	100.0%
河川・砂防	67	59	42	88.1%	62.7%	52	77.6%	53	79.1%	67	100.0%
海岸	26	25	9	96.2%	34.6%	19	73.1%	23	88.5%	26	100.0%
道路・橋梁	198	190	181	96.0%	91.4%	189	95.5%	189	95.5%	198	100.0%
漁港	68	59	27	86.8%	39.7%	46	67.6%	47	69.1%	68	100.0%
避難指示解除準備区域	査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
避難指示解除準備区域 合計	272	260	193	95.6%	71.0%	236	86.8%	242	89.0%	272	100.0%
河川・砂防	54	54	40	100.0%	74.1%	50	92.6%	51	94.4%	54	100.0%
海岸	25	25	9	100.0%	36.0%	19	76.0%	23	92.0%	25	100.0%
道路・橋梁	125	122	117	97.6%	93.6%	121	96.8%	121	96.8%	125	100.0%
漁港	68	59	27	86.8%	39.7%	46	67.6%	47	69.1%	68	100.0%
居住制限区域	査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
居住制限区域 合計	22	22	22	100.0%	100.0%	22	100.0%	22	100.0%	22	100.0%
河川・砂防	2	2	2	100.0%	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
道路・橋梁	20	20	20	100.0%	100.0%	20	100.0%	20	100.0%	20	100.0%
帰還困難区域	査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
帰還困難区域 合計	65	51	44	78.5%	67.7%	48	73.8%	48	73.8%	65	100.0%
河川・砂防	11	3	0	27.3%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%
海岸	1	0	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
道路・橋梁	53	48	44	90.6%	83.0%	48	90.6%	48	90.6%	53	100.0%



※帰還困難区域内の完了予定年度については、中間貯蔵施設整備計画や町の復興計画との調整が必要な箇所があるため、想定で記載
 ※帰還困難区域内については、災害査定が継続中である。
 ※帰還困難区域内については、H30年8月31日時点において、第48次査定まで実施済み。
 ※避難指示区域内の箇所数は、すべての市町村で区域再編の終了した平成25年8月8日時点の区域で計数を整理しているため、田村市、南相馬市、川内村、葛尾村、檜葉町、浪江町、川俣町、飯館村、富岡町の避難指示が解除になっている区域の箇所も含む。
