


## 西郷村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年11月末時点)

- 除染終了
- 除染作業中
- 平成26年度計画

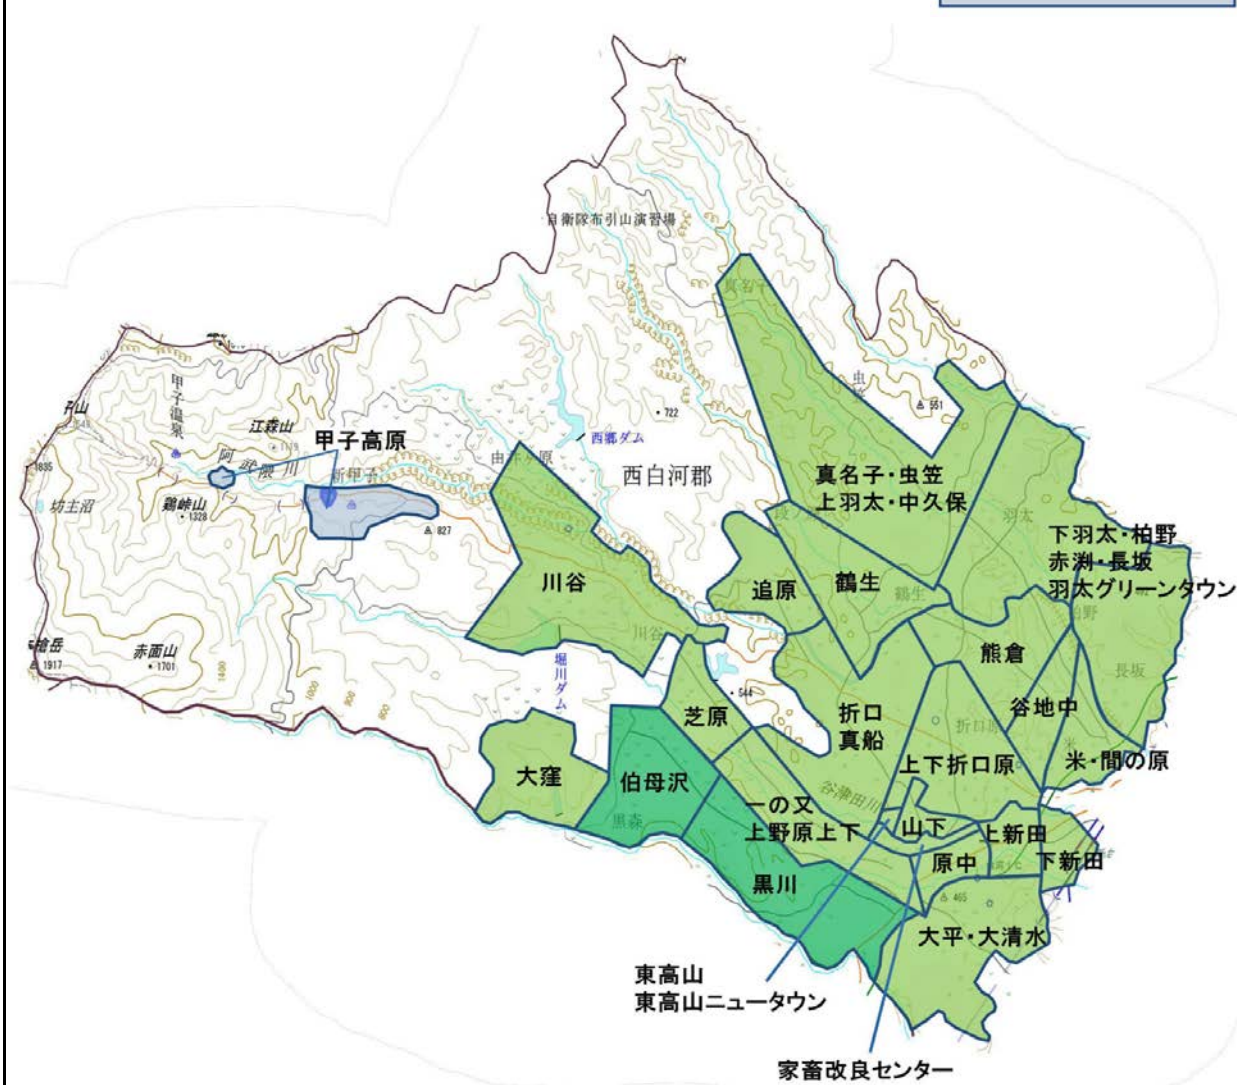

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

## 平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成26年11月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=6,965 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=258 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=353 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=237 ha

### 森林(生活圏)(ha)

進捗数  
発注数  
計画数

(参考)全体計画数=690 ha



汚染土壌剥ぎ取り作業



住宅敷地内の除染作業

---

---

## 仮置場の設置状況(平成26年9月末時点)

---

---

搬入済み 0ヶ所  
搬入中 4ヶ所  
搬入前 1ヶ所



仮置場造成の様子



仮置場での保管の様子

---

---

## 西郷村の除染情報(西郷村のホームページにリンク)

---

---

- ・ 西郷村除染実施計画  
<http://www.vill.nishigo.fukushima.jp/view.rbz?cd=1669>
- ・ 除染等に関する広報について  
<http://www.vill.nishigo.fukushima.jp/view.rbz?nd=877&ik=3&pnp=124&pnp=766&pnp=830&pnp=877&cd=2144>



西郷村放射能対策課事務室
