

平成26年度事業別評価調書（チェックリスト）


整理番号	126	事業名	交付金事業（河川） （前回評価時：広域一般河川改修事業）		補助 単独	地区名 （事業箇所名）	一級河川 <small>おおたきねがわ</small> 大滝根川	関係 市町村名	郡山市、田村市	担当部（局） 課名	土木部 河川整備課																																			
評価の対象となる理由	第1項第4号：評価実施から5年を経過し継続中の事業					前回（平成21年度）評価時の対応方針	委員会からの提言：事業継続 付帯意見：なし		県の対応方針：事業継続																																					
事業根拠法・要綱等の名称	河川法第9条第2項、河川法第79条																																													
事業の概要	[事業目的及び全体計画] (1) 事業目的 昭和41年の台風をはじめ、度重なる洪水により多大な浸水被害が発生しているため、河積の拡大を行い、沿線の人家等への浸水被害の防止を図る。 (2) 全体計画 延長：L=7,000m 工種：掘削工、護岸工等 []は、当初計画時 < >は、H21評価時					[事業に関する社会経済情勢]（特記すべき事項） (1) 現在の状況 流域内の開発により市街化が進み、沿川に人家が密集していることから、台風や豪雨による浸水被害を防止するため、河川改修の必要性は依然として高い。 (2) 変化の有無 有 <input checked="" type="radio"/> 無 (3) 変化の内容 (4) 地域の協力体制等 事業推進に対して協力的であり、早期完成を望んでいる。																																								
	事業の採択年度	S49	完成目標年度	[H25] H31	用地着手年度	S50	工事着手年度	S50																																						
	事業費（百万円）	全体事業費 （うち用地費）	これまでの投資事業費 合計	左の財源内訳又は負担割合	これまでの年度別投資実績（26年度は見込額である。）				[事業に関連する評価指標等] (1) 主要な評価指標の変化 過去の被害状況																																					
		7,060 （[4,007]） （3,551）	4,633 （1,920）	国 1/2 県 1/2 市町村 その他	～23年度	24年度	25年度	26年度	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年月</th> <th>原因</th> <th>浸水戸数（戸）</th> <th>浸水面積（ha）</th> <th>最大日雨量（mm） （最大時間雨量）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S41.9</td> <td>台風26号</td> <td>3</td> <td>55.0</td> <td>160(*)</td> </tr> <tr> <td>S56.8</td> <td>台風15号</td> <td>12</td> <td>31.2</td> <td>66(16)</td> </tr> <tr> <td>S57.7</td> <td>豪雨</td> <td>49</td> <td>48.5</td> <td>69(25)</td> </tr> <tr> <td>S61.8</td> <td>台風10号</td> <td>158</td> <td>47.6</td> <td>186(23)</td> </tr> <tr> <td>S63.7</td> <td>豪雨</td> <td>70</td> <td>5.0</td> <td>89(28)</td> </tr> <tr> <td>H1.8</td> <td>台風17号</td> <td>220</td> <td>47.5</td> <td>91(30)</td> </tr> </tbody> </table>				年月	原因	浸水戸数（戸）	浸水面積（ha）	最大日雨量（mm） （最大時間雨量）	S41.9	台風26号	3	55.0	160(*)	S56.8	台風15号	12	31.2	66(16)	S57.7	豪雨	49	48.5	69(25)	S61.8	台風10号	158	47.6	186(23)	S63.7	豪雨	70	5.0	89(28)	H1.8	台風17号	220	47.5
年月	原因	浸水戸数（戸）	浸水面積（ha）	最大日雨量（mm） （最大時間雨量）																																										
S41.9	台風26号	3	55.0	160(*)																																										
S56.8	台風15号	12	31.2	66(16)																																										
S57.7	豪雨	49	48.5	69(25)																																										
S61.8	台風10号	158	47.6	186(23)																																										
S63.7	豪雨	70	5.0	89(28)																																										
H1.8	台風17号	220	47.5	91(30)																																										
進捗率	事業費ベース	65.6%	用地費ベース	54.1%	改修済延長km (%)	3.7(52.9%)																																								
事業の進捗状況	[整備の状況] 大滝根川において、中ノ橋から安久津橋までのL=3,000m区間については改修済みとなっている。現在は、改修済み区間上流の安久津橋から大橋間L=380mの整備を進めている。 谷田川において、鬼越橋より下流L=500m区間については改修済みとなっている。現在は、改修済み区間上流の市道橋架替工事を進めている。 [事業実施上の課題や問題点、今後の事業見通し] 今後も引き続き、大滝根川及び谷田川上流区間の用地取得を進めるとともに、河道掘削等による改修を行うことにより、平成31年度の完成を目指す。 [関連事業の進捗状況] 特になし。					(2) その他特記すべき事項 特になし。 [環境への影響等] 希少野生動植物の情報に基づく対応 <input checked="" type="radio"/> 実施 ・ 未実施 ()																																								
みなし進捗率=(B)/(A)=75.5%>70%		投資済事業費 (B) =4,633 (百万円)																																												
みなし事業費 (A) = 全体事業費7,060(百万円) × 40年 =6,139 (百万円) 全体工期46年 経過年数																																														
評価					<input checked="" type="radio"/> A、 B、 C			評価					<input checked="" type="radio"/> A、 B、 C																																	

[位置図] 及び [事業概要図]

位置図




概略平面図 (大滝根川全体)

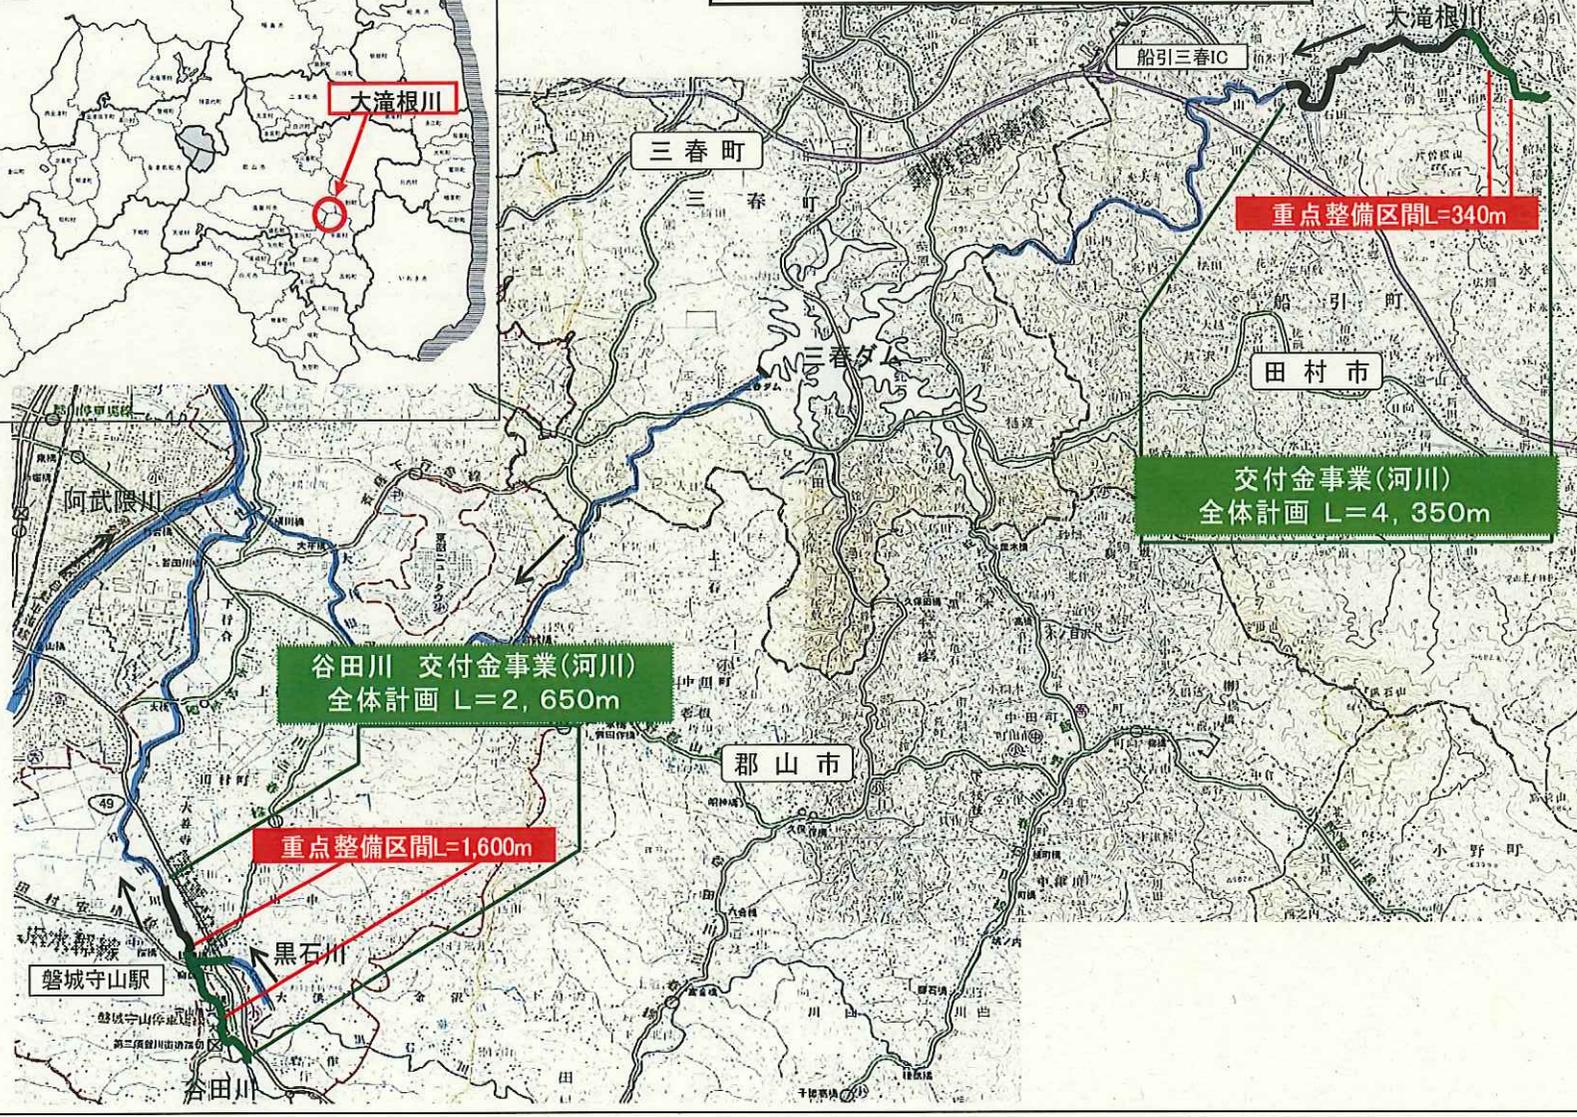

平成26年度事業別評価調書 (チェックリスト)

[位置図] 及び [事業概要図]

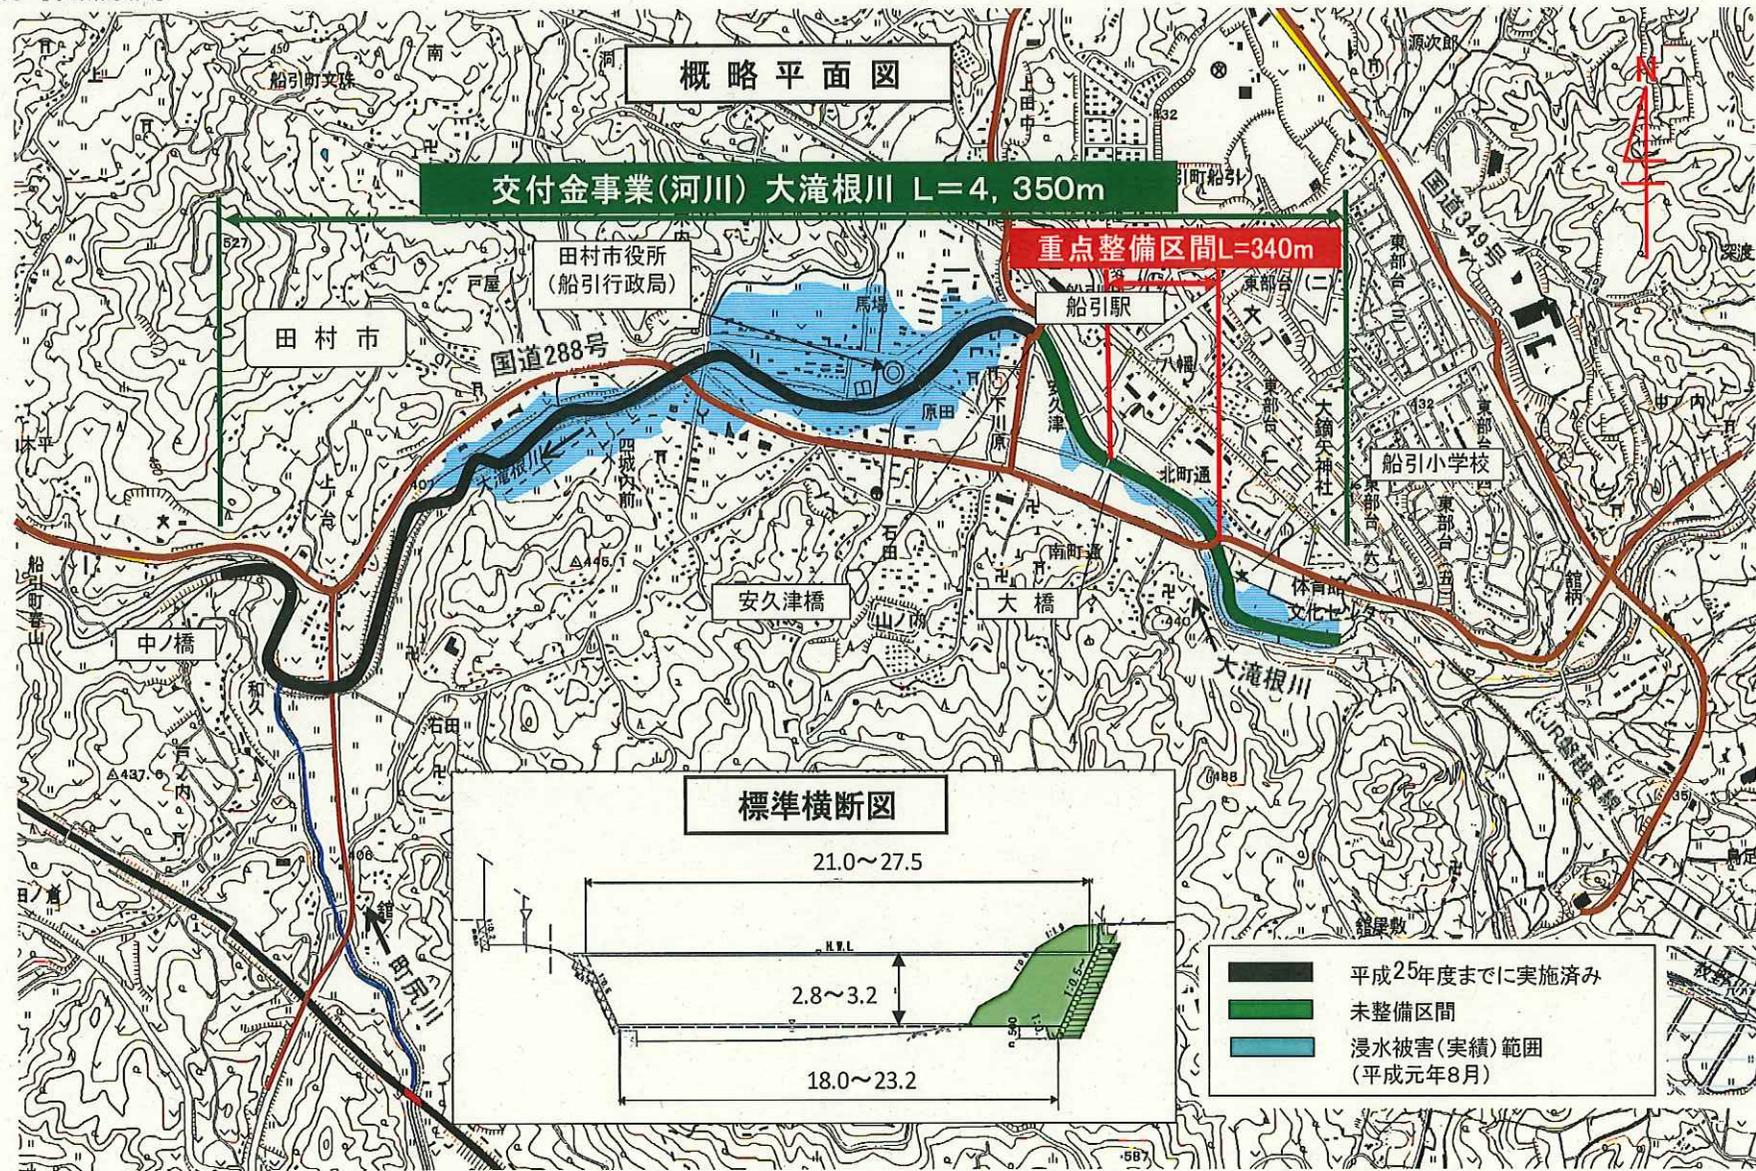

平成26年度事業別評価調書 (チェックリスト)

[位置図] 及び [事業概要図]

