


平成26年度事業別評価調書（チェックリスト）

整理番号	127	事業名	交付金事業（住宅関連・河川） （前回評価時：広域一般河川改修事業）		補助 単独	地区名 （事業箇所名）	一級河川 <small>おうせがわ</small> 逢瀬川	関係市町村名	郡山市	担当部（局） 課名	土木部 河川整備課																										
評価の対象となる理由	第1項第4号：評価実施から5年を経過し継続中の事業					前回（平成21年度）評価時の対応方針	委員会からの提言：事業継続付帯意見：なし		県の対応方針：事業継続																												
事業根拠法・要綱等の名称	河川法第9条第2項、河川法第79条																																				
事業概要	[事業目的及び全体計画] (1) 事業目的 昭和33年の豪雨をはじめ、度重なる洪水により多大な浸水被害が発生しているため、河積の拡大を行い、沿線の人家等への浸水被害の防止を図る。 (2) 全体計画 延長：L=5,020m 工種：掘削工、築堤工、護岸工等 [ ]は、当初計画時 < >は、H21評価時					[事業に関する社会経済情勢]（特記すべき事項） (1) 現在の状況 流域内の開発により市街化が進み、沿川に人家が密集していることから、台風や豪雨による浸水被害を防止するため、河川改修の必要性は依然として高い。 (2) 変化の有無 有 <input checked="" type="radio"/> 無 (3) 変化の内容 (4) 地域の協力体制等 事業推進に対して協力的であり、早期完成を望んでいる。また、沿川住民等による「逢瀬川ふれあい実行委員会」が設立され、逢瀬川に関する様々な活動がなされるなど、地域住民の河川改修に関する意識も高い。 [事業に関連する評価指標等] (1) 主要な評価指標の変化 過去の被害状況																															
	事業の採択年度	S44	完成目標年度	[H21] <H29> H31	用地着手年度	S63	工事着手年度	S63																													
	事業費（百万円）	全体事業費 （うち用地費）	これまでの投資事業費合計	左の財源内訳又は負担割合	これまでの年度別投資実績（26年度は見込額である。）																																
		[7,050] 9,050 （[4,480]） （<4,480>） （5,530）	7,851  （5,429）	国 1/2 県 1/2 市町村 その他	～23年度	24年度	25年度	26年度	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年月</th> <th>原因</th> <th>浸水戸数（戸）</th> <th>浸水面積（ha）</th> <th>最大日雨量（mm） （最大時間雨量）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S33.7</td> <td>豪雨</td> <td>524</td> <td>119.1</td> <td>113(34)</td> </tr> <tr> <td>S61.8</td> <td>台風10号</td> <td>595</td> <td>134.5</td> <td>125(28)</td> </tr> <tr> <td>H10.8</td> <td>豪雨</td> <td>7</td> <td>7.0</td> <td>109(46)</td> </tr> <tr> <td>H23.9</td> <td>台風15号</td> <td>53</td> <td>3.0</td> <td>182(44)</td> </tr> </tbody> </table>					年月	原因	浸水戸数（戸）	浸水面積（ha）	最大日雨量（mm） （最大時間雨量）	S33.7	豪雨	524	119.1	113(34)	S61.8	台風10号	595	134.5	125(28)	H10.8	豪雨	7	7.0	109(46)	H23.9	台風15号	53	3.0
年月	原因	浸水戸数（戸）	浸水面積（ha）	最大日雨量（mm） （最大時間雨量）																																	
S33.7	豪雨	524	119.1	113(34)																																	
S61.8	台風10号	595	134.5	125(28)																																	
H10.8	豪雨	7	7.0	109(46)																																	
H23.9	台風15号	53	3.0	182(44)																																	
進捗率	事業費ベース	86.8%	用地費ベース	98.2%	改修済延長km（%）		3.8(75.7%)																														
事業の進捗状況	[整備の状況] 逢瀬川において、幕ノ内橋（市道）から上流L=3,750mが概成しており、現在は逢瀬橋（国道4号）から幕ノ内橋までの区間にて、下流より用地買収を実施している。 [事業実施上の課題や問題点、今後の事業見通し] 県道橋（大窪橋）の架替に伴う県道改良事業の計画について、地元住民や道路管理者との調整に時間を要していたこと、用地買収にあたり大型補償物件（マンション）が生じたことで用地費が増額となったことから完成目標年度を延ばしているが、住民の合意形成が得られつつあり、今後も計画的に事業を推進することで平成31年度の完成を目指す。 [関連事業の進捗状況] 緊急地方道整備事業（県道荒井郡山線） L=266m, W=6.0(12.0)m (H16～) 伊賀河原地区土地区画整理事業（郡山市） A=40.2ha (H6～)																																				
	みなし進捗率=(B)/(A)=98.3%>70%		投資済事業費 (B)=7,851 (百万円)																																		
	みなし事業費 (A) = $\frac{\text{全体事業費}9,050(\text{百万円})}{\text{全体工期}51\text{年}} \times 45\text{年} = 7,985(\text{百万円})$ 経過年数																																				
評価					<input checked="" type="radio"/> A			B、C																													
評価					<input checked="" type="radio"/> A			B、C																													

平成 26 年度事業別評価調書 (チェックリスト)

地元住民・受益対象者及び関係機関の意向	<p><b>【地元住民・受益対象者の意向】</b>                  (1) 事業採択時の状況                  昭和33年の豪雨で浸水被害が発生したことから、早急な治水対策の実施が望まれていた。</p> <p>(2) 評価実施時の状況                  地元住民は河川改修事業に対して協力的であり、改修済み区間では浸水被害の軽減が図られているが、H23台風15号では阿武隈川合流点付近で内水による浸水被害が発生しており、河川改修のみならず流域総合治水に対する関心も高い。</p> <p><b>【関係機関・団体の意向】</b>                  (1) 事業採択時の状況                  地元（郡山市）から、早急な治水対策の実施が望まれていた。</p> <p>(2) 評価実施時の状況                  改修済み区間では、浸水被害の軽減が図られているが、未整備区間では断面狭小な区間が残っていることから、台風や豪雨による浸水被害を防止するため、未整備区間の早期完成を強く望んでいる。</p>	計画変更の必要性・コスト削減や代替案立案等の可能性	<p><b>【計画変更の必要性】</b>                  (1) 必要性の有無          有          <b>無</b></p> <p>(2) 計画変更の理由及び内容</p> <p><b>【代替案立案の可能性】</b>                  なし</p> <p><b>【コスト削減の取組等（特記すべき事項）】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・近隣他工事への発生土流用を積極的に進めている。</li> <li>・護岸裏込め採石等への再生骨材利用を積極的に進めている。</li> </ul>				
評 価 <b>A、</b> B、      C							
費用対効果分析等の要因の変化	<p><b>【費用対効果分析等】</b>                  (1) 手 法                  「治水経済調査マニュアル（案）」（平成17年国土交通省河川局通知）に基づき、洪水シミュレーションにより算出した、想定氾濫区域における資産等の被害額から事業を実施したことによる被害軽減額を算出し、その便益と治水施設の完成に要する今後の事業費及び維持管理費により、効果分析を行う。</p> <p>(2) 費用対効果の変化                  [前 回 評 価 時]    [今 回 評 価 時]</p> $B/C = \frac{18,234 + 209\text{百万円}}{8,839 + 1,070\text{百万円}} = \frac{18,443}{9,909} = 1.86$ $B/C = \frac{22,924 + 264\text{百万円}}{10,699 + 1,278\text{百万円}} = \frac{23,188}{11,977} = 1.94 (\geq 1.00)$ <p>B: 河川事業における総便益（氾濫防止便益＋残存価値の合計）                  C: 河川事業に要する総費用（河川改修に要する事業費＋河川維持管理に要する費用の合計）</p> <p><b>【費用の変化等で特記すべき事項】</b>                  総費用額が前回評価時と異なる理由としては、年度投資計画の見直しに伴う割引率の変更により、事業費及び維持管理費が変更となったため。</p> <p><b>【需要効果の変化等で特記すべき事項】</b>                  総便益額が前回評価時と異なる理由としては、人家戸数の変動や資産価値の見直し、年度投資額の見直しに伴う割引率の変更により、氾濫防止便益が変更となったため。</p>	総 合 評 価	<p><b>【総合評価と対応方針案】</b>                  (1) 総合評価</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     改修済み区間においては、浸水被害の軽減が図られているが、未整備区間においては、断面が狭小なため、近年にも浸水被害が発生しており、地元の要望も強いことから、今後も計画的に整備を進める必要がある。                 </div> <p>(2) 対応方針及び今後の事業の進め方</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">対応方針案</td> <td>事業継続</td> </tr> <tr> <td>今後の事業の進め方</td> <td>計画的な投資により、事業を推進する。</td> </tr> </table> <p>(3) 事業見直し継続、休止、中止する場合の対応</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>	対応方針案	事業継続	今後の事業の進め方	計画的な投資により、事業を推進する。
対応方針案	事業継続						
今後の事業の進め方	計画的な投資により、事業を推進する。						
評 価 <b>A、</b> B、      C							

[位置図] 及び [事業概要図]

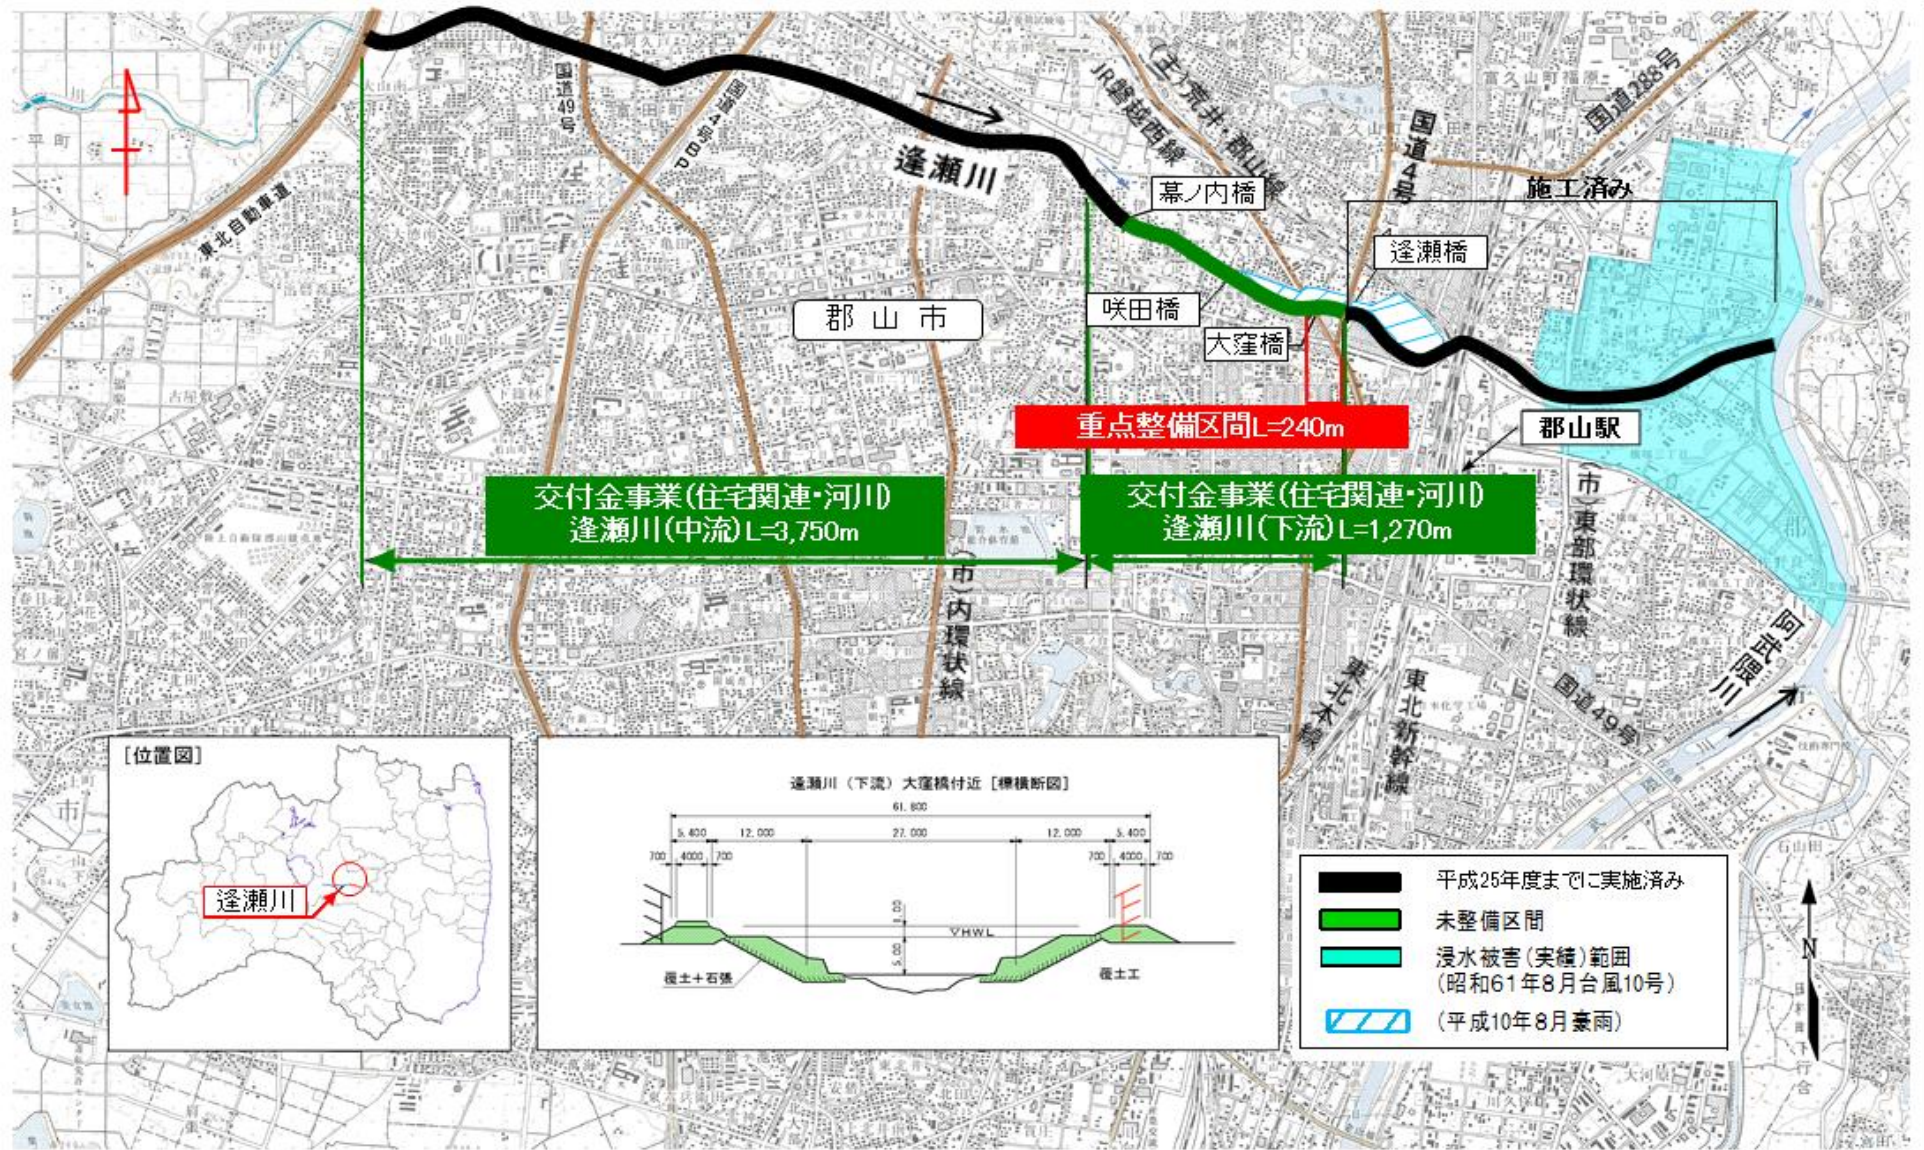

(別紙)

## 費用対効果分析

交付金事業（河川） 一級河川 逢瀬川

$$\frac{\text{効果（便益） B}}{\text{費用 C}} = \frac{\text{B①} + \text{B②}}{\text{C①} + \text{C②}}$$

### [費用項目]

- C①：治水施設完成に要する事業費（施設の建設費、用地費、補償費）
- C②：評価対象期間内での維持管理費

### [効果項目]

- B①：氾濫防止便益
  - ・河川改修により氾濫によって生じる被害（家屋や土地、農作物、公共土木施設および氾濫によって間接的に生じる営業停止などの被害額）
- B②：評価期間末における施設の残存価値

### [考え方]

- ・現在（平成25年度）を基準年度として工事期間と完成後50年間に生じる効果額、費用を算出し比較する。
- ・維持補修費は、各年事業毎の0.5%を維持管理費として事業完了後の50年分まで毎年見込み、これを割引率により現在価値化して計上している。
- ・便益は、整備された箇所から事業費に相当する便益が順次発生するものとし、さらに河川事業の耐用年数から事業完了の50年間発生する便益を割引率により現在価値化して計上する。

### 計算例

$$\frac{22,924\text{百万円} + 264\text{百万円}}{10,699\text{百万円} + 1,278\text{百万円}} = 1.94$$
