

# インフォメーション

道路管理課news

## 避難指示区域内の道路復旧、最大2年間前倒し！

避難指示区域内の重要路線等の復旧見直しを見直し、平成28年度まで完了するよう最大2年間前倒しをします。

平成27年度に完了するものは、国道288号外17路線52箇所、平成28年度に完了するものは、いわき浪江線外7路線31箇所の見直しです。

これにより、避難者の早期帰還や復興拠点の整備を後押しし、避難地域の復興に弾みを付けてまいります。

### 【更新のポイント】


- 避難指示区域内の重要路線及びその他の主要路線を平成28年度までに復旧する。
- 復旧が調整中（終期が未調整）としていたいわき浪江線について、見直しを明確にした。
- 避難指示解除準備区域は、計画どおり平成27年度に完了させる。（他事業関連を除く）
- 居住制限区域は、計画どおり平成27年度に完了させる。
- 帰還困難区域は、平成27年度に常磐自動車道との主要なアクセス道路の一部を完了させる。
- 区域内の完了率は、平成26年度の45%から平成27年度末には71%となる見込み。

	全体	平成26年度まで	H27年度	H28年度	H29年度
完了箇所数	200箇所	90箇所	142箇所	173箇所	188箇所
完了率	-	45%	71%	87%	94%


※今後の調査等で箇所数は変わる可能性あり

- 調整中の箇所については、速やかに調整を進め、できるだけ早く見直しを明確にする。  
(○今回は、市町村をはじめとする関係機関において、帰還目標や処理施設の稼働時期にあわせ、除染工程と調整を図り、更新を行ったもの。)

この記事の問い合わせ先  
：道路管理課 024-521-7468

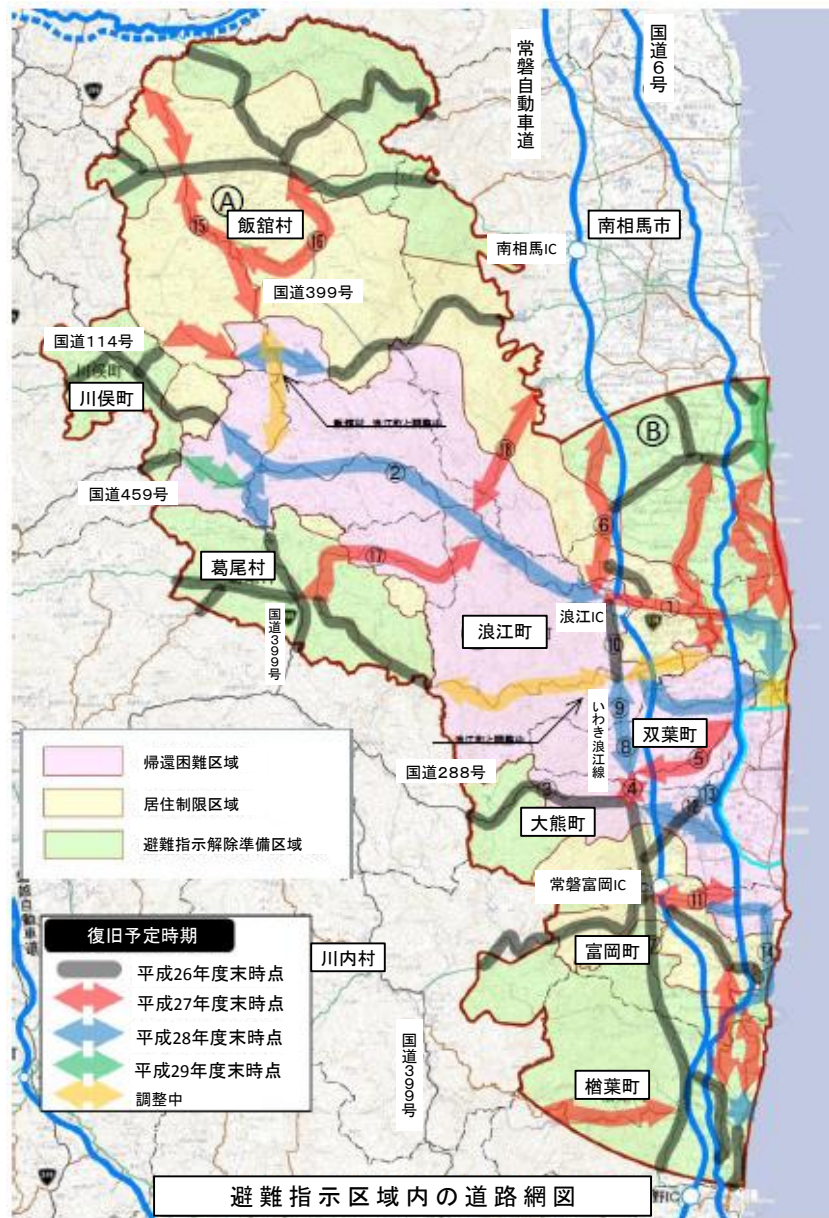

※番号は、重要路線（①～⑬）、その他の主要路線の代表箇所（⑭～⑱）を表示している。



復旧・復興に向けた取り組みを紹介します

## 福島県 公共土木施設復旧・復興情報

～ふるさとの再生と帰還にむけて～ 福島県土木部




# 楢葉町の海岸で復旧工事に着手！

（波倉地区海岸、井出地区海岸、前原・山田浜地区海岸）

東日本大震災により被災した楢葉町の波倉地区海岸、井出地区海岸、前原・山田浜地区海岸で復旧工事に着手するにあたり、平成27年7月27日（月）に安全祈願祭・起工式が開催されました。

楢葉町の3つの海岸では、震災前の防波堤よりも2.5m高い防波堤を整備します。

（右下写真の青のライン）

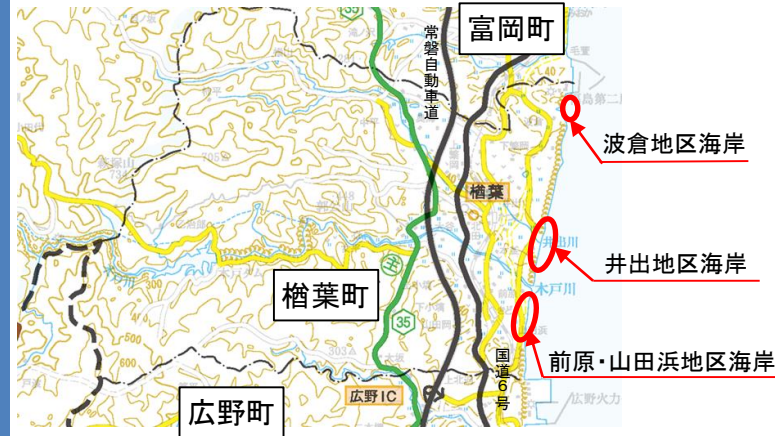

起工式  
開始ボタン押下

この記事の問い合わせ先

：富岡土木事務所 河川・海岸課 0240-23-6613

はちまんこうじ

# 復興公営住宅「八幡小路団地1号棟」完成！

いわき市平八幡小路の復興公営住宅「八幡小路団地1号棟」が完成し、平成27年7月21日（火）に鍵引渡し式が行われました。8月1日（土）から入居開始となりました。これで県が整備する復興公営住宅において、いわき市内の入居可能戸数は262戸となりました。



鍵引渡し式



復興公営住宅全景

この記事の問い合わせ先

：いわき建設事務所 建築住宅部 0246-24-6104




## Report

■【県土木部全体】平成23年被災・災害復旧事業の進捗状況（平成27年7月31日現在）

- ・東日本大震災 着手 **93%** 完了 **76%**
- ・新潟・福島豪雨 着手 **100%** 完了 **98%**
- ・台風15号 着手 **100%** 完了 **98%**

※率の算定は事業実施箇所数に対し、事業着手した箇所数の割合を着手率、事業完了した箇所数の割合を完了率、として算出しています。

※帰還困難区域の査定が未実施の箇所は含まれていません。今後の査定実施により対象が増加する場合があります。

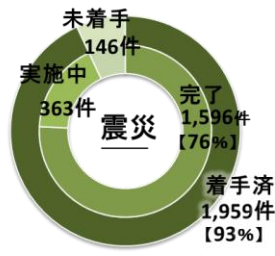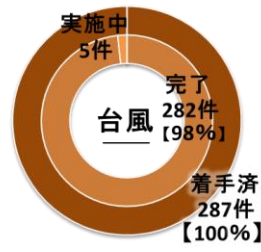

### ■もう一言

福島県公式Facebook「ふくしまからはじめよう。」において、土木部の広報の取り組みが平成27年8月11日に掲載されました。

<https://www.facebook.com/FutureFromFukushima>

福島県土木部 土木企画課 防災担当

TEL:024-521-7890 FAX:024-521-7950

Mail:doboku\_bousai@pref.fukushima.lg.jp

