
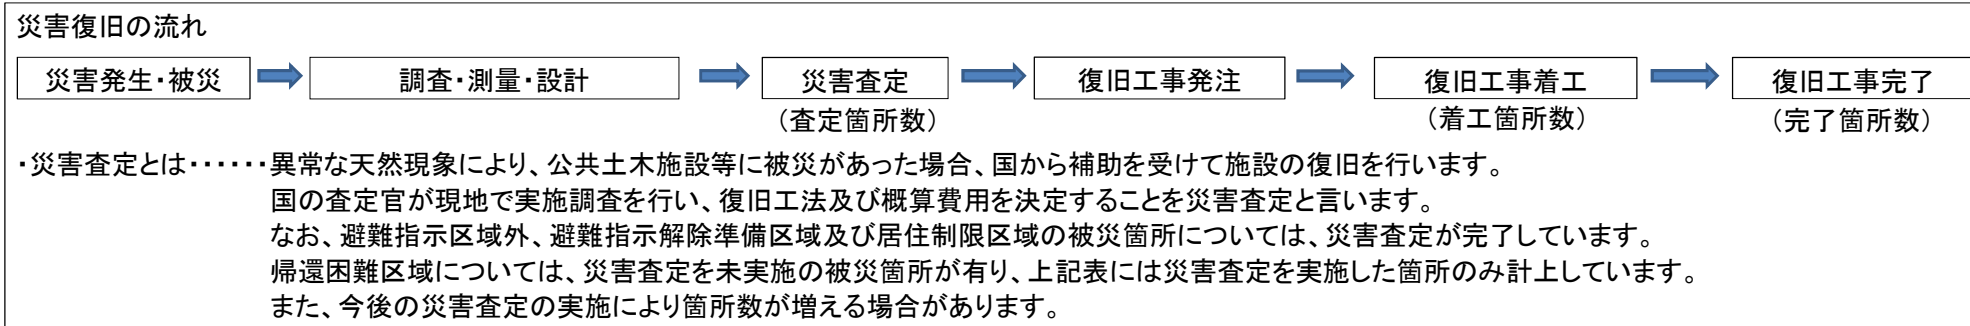







# 東日本大震災の災害復旧の進捗状況 今後の見通しについて

平成29年2月28日現在

県全体(避難指示区域外+避難指示区域内)	平成29年2月末実績					対査定箇所		平成28年度末見込み		平成29年度末見込み		平成30年度末見込み		平成31年度末見込み	
	A 査定箇所	B 着工箇所	C 完了箇所	B/A 着工率	C/A 完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
県全体 合計	2,122	2,107	1,836	99%	87%	1,868	88%	2,011	95%	2,116	99.7%	2,120	99.9%	2,120	99.9%
河川・砂防	272	271	242	99.6%	89%	246	90%	254	93%	270	99.3%	271	99.6%	271	99.6%
海岸	157	155	90	99%	57%	92	59%	127	81%	153	97%	156	99%	156	99%
道路・橋梁	798	795	749	99.6%	94%	786	98%	794	99.5%	798	100%	798	100%	798	100%
港湾	331	331	311	100%	94%	311	94%	331	100%	331	100%	331	100%	331	100%
漁港	467	458	347	98%	74%	336	72%	408	87%	467	100%	467	100%	467	100%
下水	3	3	3	100%	100%	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%
公園	5	5	5	100%	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%
公営住宅	89	89	89	100%	100%	89	100%	89	100%	89	100%	89	100%	89	100%
避難指示区域外	査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
避難指示区域外 合計	1,782	1,781	1,635	99.9%	92%	1,638	92%	1,762	98.9%	1,782	100%	1,782	100%	1,782	100%
河川・砂防	215	215	205	100%	95%	209	97%	211	98%	215	100%	215	100%	215	100%
海岸	131	130	84	99%	64%	86	66%	115	88%	131	100%	131	100%	131	100%
道路・橋梁	609	609	607	100%	99.7%	608	99.8%	609	100%	609	100%	609	100%	609	100%
港湾	331	331	311	100%	94%	311	94%	331	100%	331	100%	331	100%	331	100%
漁港	399	399	331	100%	83%	327	82%	399	100%	399	100%	399	100%	399	100%
下水	3	3	3	100%	100%	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%
公園	5	5	5	100%	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%
公営住宅	89	89	89	100%	100%	89	100%	89	100%	89	100%	89	100%	89	100%
避難指示区域内	査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
避難指示区域内 合計	340	326	201	96%	59%	230	68%	249	73%	334	98%	338	99%	338	99%
河川・砂防	57	56	37	98%	65%	37	65%	43	75%	55	96%	56	98%	56	98%
海岸	26	25	6	96%	23%	6	23%	12	46%	22	85%	25	96%	25	96%
道路・橋梁	189	186	142	98%	75%	178	94%	185	98%	189	100%	189	100%	189	100%
漁港	68	59	16	87%	24%	9	13%	9	13%	68	100%	68	100%	68	100%
避難指示解除準備区域	査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
避難指示解除準備区域 合計	271	259	166	96%	61%	165	61%	183	68%	267	99%	271	100%	271	100%
河川・砂防	54	54	36	100%	67%	36	67%	42	78%	53	98%	54	100%	54	100%
海岸	25	25	6	100%	24%	6	24%	12	48%	22	88%	25	100%	25	100%
道路・橋梁	124	121	108	98%	87%	114	92%	120	97%	124	100%	124	100%	124	100%
漁港	68	59	16	87%	24%	9	13%	9	13%	68	100%	68	100%	68	100%
居住制限区域	査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
居住制限区域 合計	23	23	21	100%	91%	22	96%	22	96%	23	100%	23	100%	23	100%
河川・砂防	2	2	1	100%	50%	1	50%	1	50%	2	100%	2	100%	2	100%
道路・橋梁	21	21	20	100%	95%	21	100%	21	100%	21	100%	21	100%	21	100%
帰還困難区域	査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
帰還困難区域 合計	46	44	14	96%	30%	43	93%	44	96%	44	96%	44	96%	44	96%
河川・砂防	1	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
海岸	1	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
道路・橋梁	44	44	14	100%	32%	43	98%	44	100%	44	100%	44	100%	44	100%

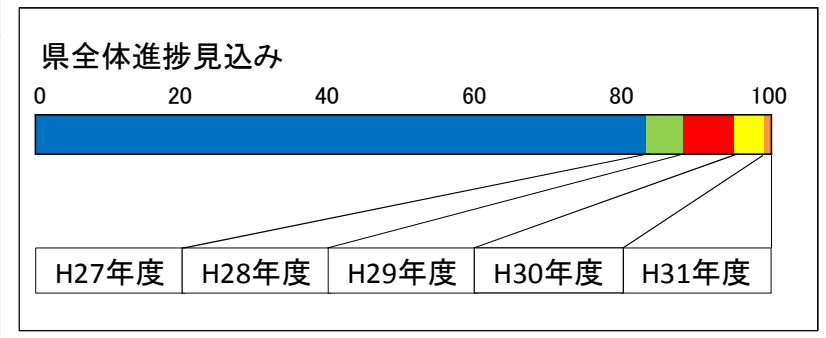

※平成29年2月に災害査定を実施した、帰還困難区域の河川(1箇所)及び海岸(1箇所)については、完了時期未定。  
 ※着工率、完了率は査定箇所に対する割合  
 ※災害査定実施箇所のみ記載  
 ※避難指示区域内の箇所数は、すべての市町村で区域再編の終了した平成25年8月8日時点の区域で計数を整理しているため、田村市、南相馬市、葛尾村、川内村、楢葉町の避難指示が解除になっている区域の箇所も含む。

# 避難指示区域の災害復旧の箇所数の考え方

避難指示区域内の災害復旧の箇所数は、全ての市町村で避難指示区域の再編が終了した平成25年8月8日時点の区域で計数を整理しているため、田村市、南相馬市、川内村、葛尾村、楢葉町の避難指示が解除された区域の箇所も含んだ値となっています。

