

# 県道いわき石川線法面崩落事故・第2回関係機関連絡会議

## 次 第

日時：平成26年4月16日(水) 14:00～

場所：いわき合同庁舎4階大会議室

1 開 会

2 あいさつ

3 議 事

(1)これまでの経過と現状について

(2)今後の対応方針（確認事項）について

(3)県民生活等への影響把握と対応について

4 その他

5 閉 会

## 県道いわき石川線法面崩落事故・関係機関

機関名
○国機関
磐城国道事務所
○県機関
いわき地方振興局
いわき農林事務所
いわき教育事務所
いわき建設事務所
勿来土木事務所
石川土木事務所
小名浜港湾建設事務所
○市町村
いわき市
いわき市勿来支所
いわき市遠野支所
いわき市田人支所
古殿町
○警察関係
いわき南警察署
石川警察署
○消防関係
いわき市消防本部警防課
いわき市消防本部勿来消防署
いわき市消防本部常磐消防署
いわき市消防本部常磐消防署遠野分遣所
須賀川地方広域消防本部警防課
須賀川地方広域消防組合石川消防署古殿分署

第3回土木部対策本部会議  
平成26年4月11日時点

## いわき石川線法面崩落対策に関する確認事項

土木部県道いわき石川線法面崩落事故対策本部  
いわき建設事務所県道いわき石川線法面崩落事故現地対策本部

### ■これまでの経過

4月5日早朝 いわき市田人町石住字才鉢地内で法面崩落があり、主要地方道  
いわき石川線が全面通行止めとなっている。

- 人的被害 無し
- 迂回路 国道49号、国道289号
- 孤立集落 無し
- 崩落状況 高さ約40メートル、延長約30メートルの法面崩落
- 交通規制 いわき市遠野町根岸～古殿町大字松川字横川（延長約22km）

4/4（金） 浜通り南部 大雨洪水警報発令（同日中に解除）  
・連続雨量：133mm 時間最大雨量：21mm

4/5（土） 全面通行止め開始（10:00）  
現地調査実施

4/6（日） 現地調査継続及び伸縮計設置

4/7（月） 土木部・出先機関事故対策本部の設置

4/8（火） 現地の関係機関による連絡調整会議の実施  
・被害状況や今後の見通し等の情報共有  
・全面通行止めに対する協力依頼

4/9（水） 第二回土木部事故対策本部会議

4/11（金） 第三回土木部事故対策本部会議

## ■現 状

- ✓ 法面上部に亀裂及び不安定土塊がある（別紙1参照）
- ✓ 幅30m、高さ40mの範囲で不安定土塊は移動が継続している

移動量（4月10日18時現在）

単位mm

	累 計	直近1日	時間最大移動量
S-1	65.6	6.6	2.1（4月7日1時）
S-2	42.5	4.4	3.4（4月7日0時）

- 観測開始日 : 4月6日（日）15時
- 時間移動量警報値 : 2.0mm/h（8日以降は2.0mm以下）

## ■確認事項

### 1. 最優先課題は早期の交通確保

- ✓ 本路線は、福祉・医療、教育、物流等への影響が大きい
- ✓ 本路線は、緊急輸送路二次確保路線
- ✓ 仮設防護柵、河川側拡幅、仮橋による迂回路などの交通確保策を検討する

### 2. 2ヶ月程度で恒久対策を決定する

- ✓ 地形・用地測量、調査、設計の実施
- ✓ 国有保安林関係の協議を実施
- ✓ 災害復旧事業による採択に向けた調整
- ✓ 規制解除時期は、見通しがつき次第公表する


### 3. 適時・適切な情報提供

- ✓ 関係機関連絡会議を通じて対応状況や今後の予定を情報提供
- ✓ 状況に応じ随時開催
- ✓ ホームページ、チラシ等による広報

### 4. 県民生活への影響低減に努める

- ✓ 福祉・医療、教育、物流等への影響の把握
- ✓ 警察、消防、学校等関係機関と連携・調整し対応
- ✓ 関係機関連絡会議を活用



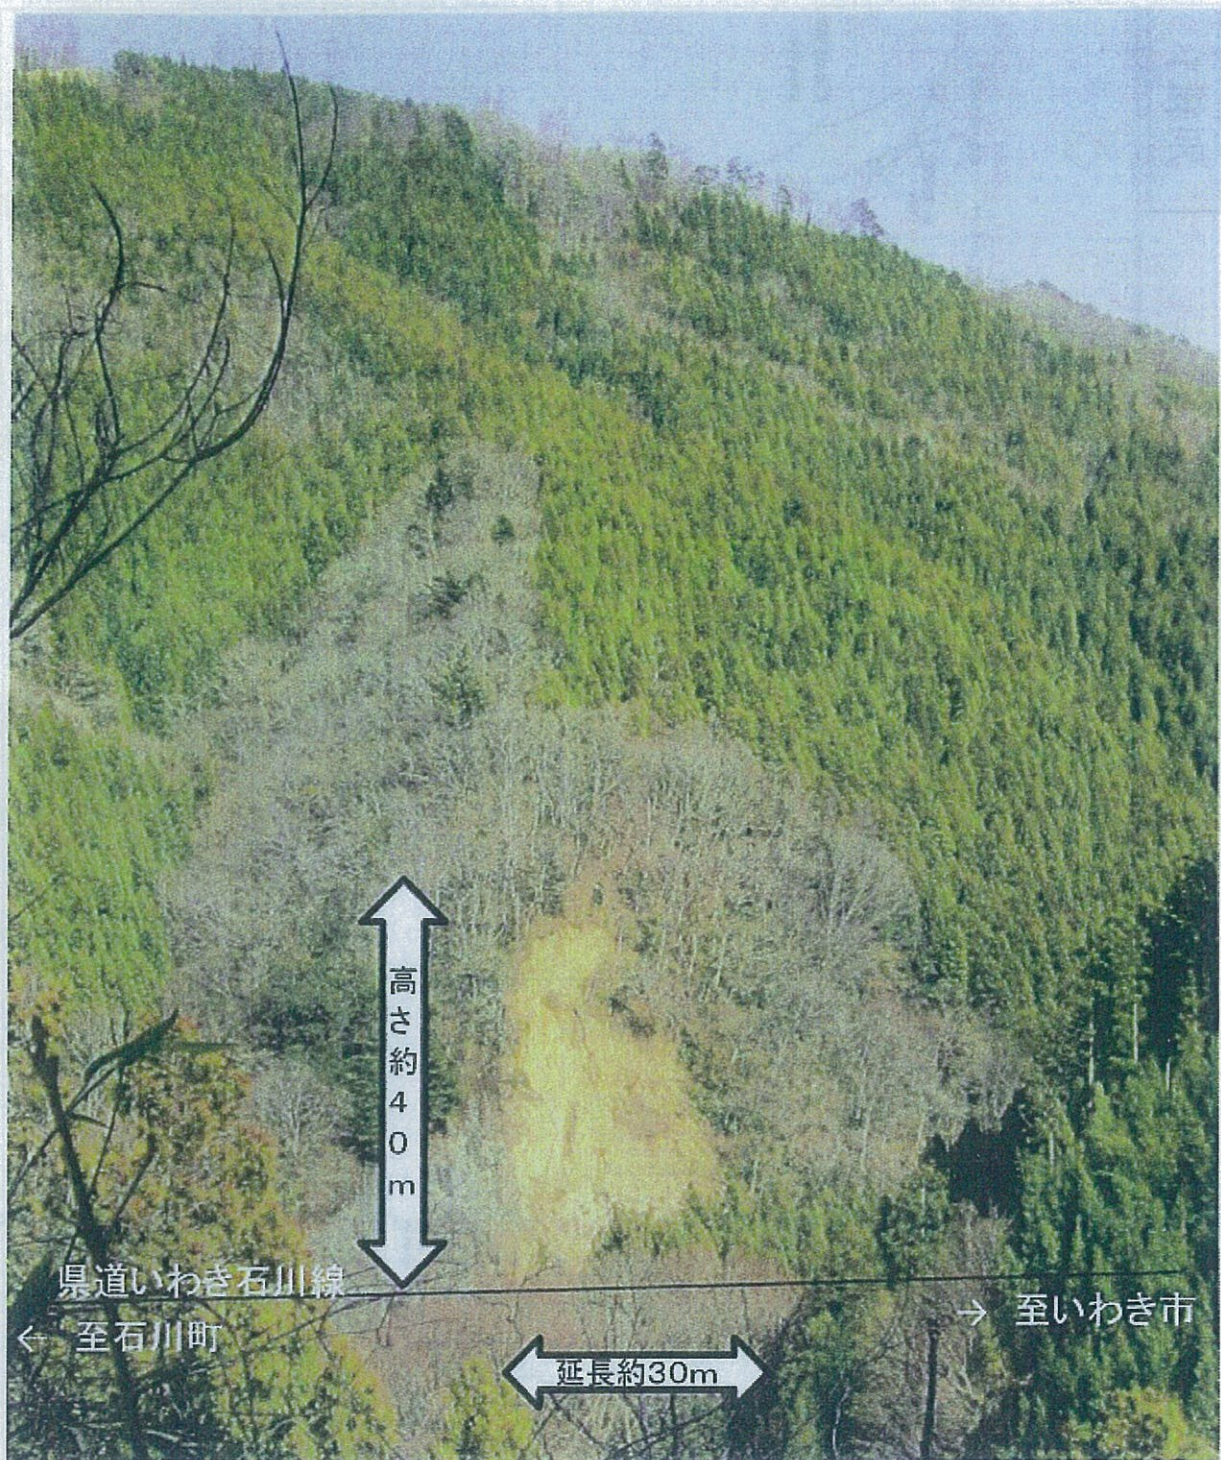

4月11日(土木部対策本部会議)から14日までの動き  
○12日(土)、13日(日)道路パトロール実施……異常なし  
○13日(日)地震発生(震度3)……異常なし



いわき石川線(いわき市田人町石住地内)土砂崩落現場 見取図

別紙1

